agrega construtoras

# Manual de operação

Engenharia, suprimentos, medições, financeiro e gerencial para construtoras e incorporadoras.

**Versão 1.0 · outubro de 2026**

Para dono, gestor, engenharia, orçamento, compras, financeiro, administrativo, vendas e almoxarife.

# Sumário

Leia o capítulo 1 e siga a ordem do capítulo 2 para implantar o sistema. Depois, use o manual como consulta.


**1 Primeiros passos**
Acesso, perfis e o menu

**2 Implantação**
A ordem certa de cadastrar tudo

**3 Engenharia**
Obras, EAP e orçamento, planejamento e acompanhamento

**4 Suprimentos**
Solicitações, cotações, pedidos e contratos

**5 Estoque**
Estoques, saldo, etiquetas QR e saídas para a obra

**6 Medições e pagamentos**
Medições, descontos e autorizações de pagamento

**7 Propostas e contratos**
Cinco tipos de proposta, aceitação, contrato e contas a receber

**8 Financeiro**
Plano de contas, lançamentos, bancos e conciliação

**9 Gerencial**
DRE, fluxo de caixa, Curva S, indicadores e aprovações

**10 Administrativo**
Clientes, fornecedores, credores e colaboradores

**11 Configurações**
Empresa, usuários, backup e exportação

**12 Rotinas recomendadas**
O que fazer todo dia, toda semana e todo mês

**13 Dúvidas frequentes**
Problemas comuns e como resolver

**14 Glossário**
Os termos usados no sistema

# 1 Primeiros passos

O Agrega Construtoras funciona no navegador, no computador e no celular, sem instalar nada. Cada construtora enxerga só os próprios dados.

## Acesso

1. Abra o endereço do Agrega informado pela sua empresa.
2. Entre com o **e-mail** e a **senha** cadastrados pelo dono ou por um administrador.
3. Troque a senha provisória na área `Minha conta`.

## Perfis

O perfil indica a função de cada pessoa. O dono ou um administrador pode ajustar os módulos liberados para cada uma.

### Dono

Acesso a tudo. Aprova todos os valores e define as regras de aprovação.

### Gestor

Acompanha a gestão da empresa. Pode ser administrador e aprovar até o limite definido.

### Engenheiro de obra

Trabalha nas obras da engenharia e nas medições dos contratos.

### Orçamentista

Monta a EAP, o orçamento e o planejamento das obras.

### Comprador

Solicitações, cotações, pedidos e contratos de suprimentos.

### Financeiro

Lançamentos, contas, bancos, conciliação e relatórios financeiros.

### Administrativo

Cadastros de clientes, fornecedores, credores e colaboradores.

### Vendedor

Módulo comercial: vendas da empresa.

### Almoxarife

Só Suprimentos › Estoque: estoques, etiquetas QR e saídas para a obra.

**Módulos por pessoa**

Em `Configurações › Usuários e acessos` é possível marcar os módulos que cada pessoa vê. O menu mostra só os módulos liberados.

**Dados restritos**

Saldos bancários e fluxo de caixa só aparecem para quem tem acesso a eles. Peça ao dono para ajustar, se precisar.

# 1 Menu por módulos

O menu muda conforme os módulos liberados para cada pessoa. Os módulos ficam sempre na mesma ordem.

## Menu por módulos

No computador, o menu fica à esquerda e mostra os módulos. Clique no módulo para abrir os itens. No celular, use o menu da barra de baixo.

| Módulo | O que tem dentro |
|---|---|
| **Engenharia** | Obras, insumos, serviços, EAP e orçamento, planejamento, acompanhamento e relatórios |
| **Suprimentos** | Solicitações de compra e de serviços, cotações, pedidos, contratos, medições e estoque |
| **Financeiro** | Contas a pagar e a receber, lançamentos, bancos e caixa, conciliação OFX, plano de contas |
| **Comercial** | Propostas de obra, vendas e relatórios comerciais |
| **Gerencial** | DRE, fluxo de caixa, Curva S, indicadores, aprovações e autorizações de pagamento |
| **Administrativo** | Clientes, fornecedores, credores e colaboradores |
| **Configurações** | Empresa, usuários e acessos, mural de avisos, minha conta, relatórios de uso. Fica sempre por último. |

# 2 Implantação

Siga esta ordem na primeira vez. Cada etapa usa informações da anterior: a obra precisa existir antes do orçamento, e o orçamento antes da solicitação de serviços.

Empresa → Usuários → Plano de contas → Cadastros → Obra → EAP e orçamento → Planejamento → Bancos

1. **Empresa.** Em `Configurações › Empresa`, confira razão social, CNPJ, endereço e logo. Esses dados aparecem nos documentos impressos.
2. **Usuários.** Em `Configurações › Usuários e acessos`, cadastre cada pessoa com o perfil certo e ajuste os módulos, se precisar.
3. **Plano de contas.** Em `Financeiro › Plano de contas`, revise as categorias (por exemplo, 3.7 Serviços terceirizados). Elas são usadas nos lançamentos e nas solicitações de serviço.
4. **Cadastros.** Cadastre clientes, fornecedores, credores e colaboradores em `Administrativo`. A leitura por foto ou PDF ajuda (capítulo 10).
5. **Obra.** Em `Engenharia › Obras`, cadastre a obra com código, nome, endereço e centro de custo.
6. **Insumos e serviços.** Cadastre os insumos e serviços da obra em `Engenharia`.
7. **EAP e orçamento.** Monte a estrutura da obra (etapas, subetapas e tarefas) e lance a quantidade de cada serviço.
8. **Planejamento.** Cadastre as atividades ligadas à EAP, com datas e predecessoras. O planejamento alimenta a Curva S.
9. **Bancos e caixa.** Cadastre as contas bancárias e o caixa em `Financeiro › Bancos e caixa`.
10. **Regras de aprovação.** Em `Gerencial › Aprovações`, defina até qual valor os administradores aprovam e quais valores dispensam aprovação.

> **Antes de lançar movimentos**
> Confirme o plano de contas e o orçamento da obra. Solicitações, contratos e medições usam as categorias e as quantidades do orçamento.

# 3 Engenharia


A engenharia organiza a obra: o que será feito (EAP e orçamento), quando (planejamento) e quanto já foi executado (acompanhamento).

## Obras

Cada obra tem código, nome, endereço e centro de custo, usado para apropriar as despesas.

## EAP e orçamento

A EAP divide a obra em níveis: **etapa**, **subetapa** e **tarefa**. Cada linha folha recebe os serviços do orçamento, com a quantidade e o custo calculado a partir da composição de insumos. O BDI é aplicado sobre o custo direto.




## Planejamento

Cadastre as atividades ligadas às linhas da EAP, com início, duração e predecessoras. O sistema calcula as datas a partir da cadeia de predecessoras. O custo de cada linha é distribuído ao longo das datas da atividade: essa distribuição é o **previsto** da Curva S.

# 3 Engenharia (continuação)

## Cadastro de insumo

Em `Insumos › Novo insumo`, escolha a **tabela** que vai receber o item. O código é gerado sozinho, na sequência da tabela (ex.: INS-0001).

- **Preço.** Escolha *Não registrar agora* ou *Informar valor*. O preço pode ficar para depois.
- **Unidades de compra.** Se o insumo é orçado numa unidade e comprado em outra, cadastre a unidade de compra e quantas unidades do orçamento cabem nela. Ex.: aço orçado em kg e comprado em barra: 1 barra = 46,2 kg.

Depois da primeira compra, o preço pode vir da nota mais recente. Em `Engenharia › Tabelas de referência`, na linha do insumo de uma tabela própria, use **Usar última compra**. O sistema converte o valor para a unidade do cadastro.

## Acompanhamento de obra

Registre as medições físicas por data, em percentual ou em quantidade executada, por linha folha da EAP. O valor executado é o percentual da linha multiplicado pelo custo da linha.

**Indicadores**

**SPI**

= executado ÷ previsto. Abaixo de 1, a obra está atrasada em relação ao planejado.

**CPI**

= executado ÷ realizado (despesas confirmadas). Abaixo de 1, a obra gasta mais do que o executado.

**Curva S**

Mostra previsto, executado e realizado mês a mês. A curva vai até o mês de hoje, ou até o fim do planejamento se ele for depois. Executado e realizado só aparecem até hoje.

## Tabelas de referência e relatórios

As tabelas de referência trazem insumos e composições de preços. Copie para a obra só o que for usar e ajuste os preços sem alterar a tabela original. Os relatórios da obra ficam em `Engenharia › Relatórios`.

# 4 Suprimentos

Do pedido de compra ou de serviço até o contrato. Cada etapa tem registro próprio.

Solicitação → Cotação → Pedido ou contrato → Medição ou recebimento → Autorização → Contas a pagar


## Solicitação de compra (insumos)

Escolha a obra, a data e a data em que o material é necessário. Use **Buscar insumo** para filtrar pelo código ou parte da descrição. Adicione os insumos com a quantidade na unidade do item.

Se o insumo tem unidades de compra, aparece o campo **Unidade do pedido**. Digite a quantidade nessa unidade (ex.: 2 barras) e confira o equivalente na unidade do orçamento (ex.: 92,4 kg). O pedido, a cotação e a nota seguem a unidade escolhida. A entrada no estoque é convertida para a unidade do orçamento.

## Solicitação de serviços

Serve para contratar serviços de terceiros. Escolha a obra, a **categoria** (do plano de contas, por exemplo 3.7 Serviços terceirizados) e o serviço cadastrado no orçamento da obra. Ao escolher o serviço, o sistema mostra a unidade ao lado da quantidade e a referência da obra:




O **saldo a contratar** é o orçado menos o já contratado e o já medido, na mesma unidade do serviço. Contratos cancelados não entram nessa conta.

## Cotações

1. **Criar a cotação** a partir da solicitação e envie aos fornecedores.
2. **Registrar as respostas.** Para cada fornecedor, informe o preço unitário de cada item, o prazo de entrega, a condição de pagamento, o frete, a validade e observações.
3. **Ler a proposta por PDF ou foto.** O botão de leitura preenche preços e condições a partir do documento. Os dados aparecem na tela para conferência e só são gravados quando você salva a resposta. Itens sem preço na proposta são avisados.
4. **Mapa de cotação.** Compare os preços lado a lado e escolha o fornecedor de cada item.

# 4 Suprimentos (continuação)

## Pedidos de compra e contratos

Pedidos e contratos de serviço passam pela alçada de aprovação e ficam vigentes depois de aprovados.

| Tipo de contrato | Como é medido |
|---|---|
| **Por itens** | Quantidade e preço unitário, por quantitativos ou percentual. |
| **Global** | Valor total, por valor ou percentual do contrato. |
| **Retenções** | Caução, ISS, INSS, IR e PIS/COFINS/CSLL, descontados de cada pagamento. |

# 5 Estoque

O estoque mostra, para cada insumo da obra, quanto há disponível e em qual etapa da EAP. É isso que permite saber se um insumo pedido de novo é para a mesma etapa ou para outra.

## Como o saldo entra

1. **Solicitação.** Cada insumo pedido já está apropriado a uma etapa da EAP.
2. **Pedido e nota.** O pedido de compra guarda essa apropriação. Quando a nota de compra é ligada ao pedido, cada item herda a obra, o insumo da obra e a etapa.
3. **Compra direta.** Se a nota não vem de um pedido, escolha em cada item do lançamento da nota a **obra**, o **insumo da obra**, a **etapa da EAP** e, se quiser, o **estoque de recebimento** (por padrão, o Recebimento da obra).
4. **Confirmação.** Ao confirmar a nota, cada item com apropriação completa entra no estoque escolhido e recebe uma **etiqueta com QR code**. Item sem obra, insumo ou etapa não entra no estoque e não gera etiqueta.

# 5 Estoque (continuação)

## Estoques

Em `Suprimentos › Estoque`, clique em **Novo estoque**. Informe o nome e, se o estoque for de uma obra, escolha a **obra** a que ele pertence; sem obra, ele é um estoque geral. O código (EST-0001, EST-0002...) é dado automaticamente. Cada obra tem o estoque de **Recebimento**, que recebe as notas e não pode ser desativado. Os outros servem para organizar o material, como almoxarifado ou canteiro. Use **Desativar** para tirar um estoque de uso sem apagá-lo.

## Saldo

Escolha a obra no topo da tela. A lista mostra o saldo de cada insumo. Clique no insumo para ver quanto há em cada estoque e etapa. O saldo é a soma das entradas menos as saídas daquela etapa.

Suprimentos › Estoque · obra 0012

| Insumo | Saldo | Apropriação (etapa) |
|---|---|---|
| Cimento CP-II 50 kg | 180 sc | Recebimento · 1.2.1 Fundação: 120 · 2.1.3 Alvenaria: 60 |

## Na solicitação de insumos

Ao escolher um insumo na solicitação, o sistema mostra se ele já está em estoque, quanto há em cada etapa e quanto há na etapa escolhida. Assim você decide se pede de novo ou usa o que já existe.

> **Só o que tem apropriação entra**
> Notas de compra sem obra, insumo ou etapa não aparecem no saldo. Confira o lançamento da nota antes de confirmar.

# 5 Estoque (saídas)

## Etiquetas QR

Cada item recebido gera uma etiqueta com QR code, com o insumo, a obra, a etapa, a data e o estoque. As etiquetas ficam em `Suprimentos › Estoque › Etiquetas (QR)`, onde também é possível imprimi-las. A saída de material é sempre feita lendo a etiqueta do insumo; não existe mais saída por quantidade digitada.

## Saída de material

1. **Abra a saída.** Em Suprimentos › Estoque, escolha a obra e vá até **Saída de material**.
2. **Colaborador.** Escolha quem pegou o material. A lista traz os colaboradores cadastrados em `Administrativo › Colaboradores`.
3. **Etapa e dados.** Escolha a etapa da EAP, a data e, se precisar, uma observação.
4. **Leia a etiqueta.** Use a câmera (Ler QR com a câmera) ou digite o código. O sistema mostra o insumo e o saldo. Não aceita etiqueta de outra obra, sem saldo ou de outra etapa.
5. **Quantidade e registro.** Informe quanto sai de cada insumo e registre. A saída recebe um número (SAI-0001…) e o saldo da etiqueta diminui. Quem registra, o almoxarife, fica gravado como quem entregou.

## Colaboradores

Quem retira material é um colaborador do cadastro do **Administrativo**; não há cadastro separado no estoque. Quem deixa a empresa deve ser desativado no cadastro de colaboradores: some da lista de saída, mas o histórico fica.

## Transferir entre estoques

Para mover material de um estoque para outro, use **Transferir entre estoques**: insumo, etapa, origem, destino, quantidade e data. A transferência não gera etiqueta nova, e a etiqueta continua ligada ao estoque de origem.


> **Prefira receber no estoque certo**
> Como a etiqueta não muda na transferência, o ideal é escolher o estoque certo ao receber a nota, e não transferir depois.

# 6 Medições e pagamentos

A medição registra o que foi executado no período. Aprovada a medição, a autorização de pagamento calcula o valor líquido a pagar.

## Nova medição

1. Escolha o **contrato**, o período medido e a data da medição.
2. Escolha como medir. Em contrato **por itens**, use `Quantitativos` (quantidade executada de cada serviço) ou `% do contratado` (um percentual aplicado a todos os serviços). Em contrato **global**, informe o valor ou o percentual.
3. Se houver valores a deduzir do pagamento ao terceiro, informe-os em **Descontos**: adiantamento, alimentação, EPI e outros. Cada desconto tem descrição e valor.
4. **Salve** e envie para aprovação.

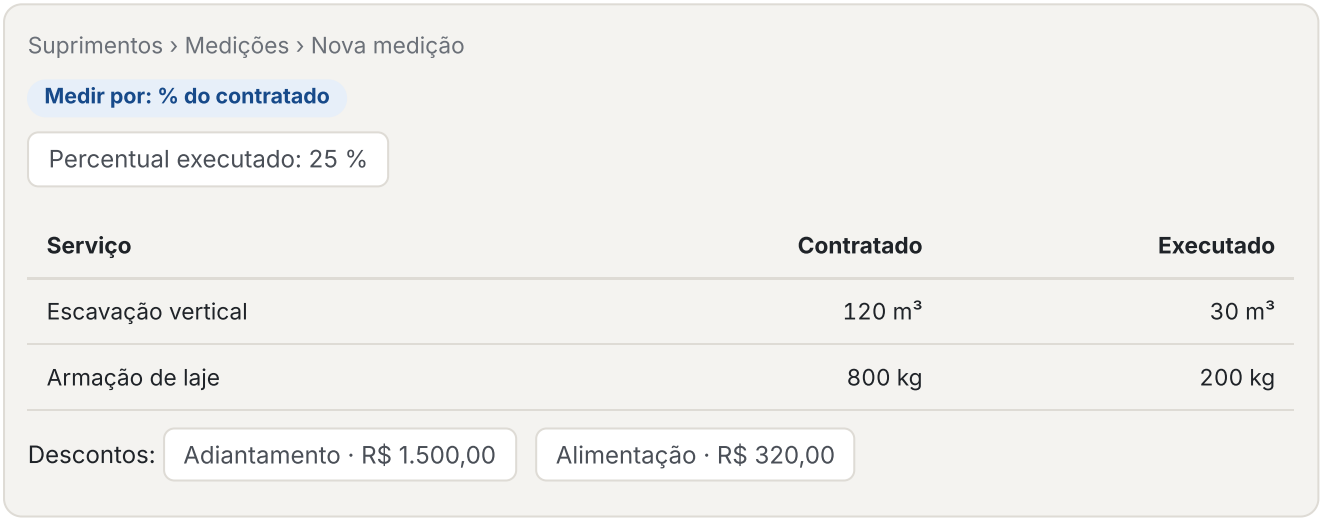


## Aprovação

A medição enviada entra na fila de aprovações (*Gerencial › Aprovações*). Quem tem alçada aprova. Confira quantidades, percentuais e descontos antes de enviar.

## Autorização de pagamento

A partir da medição, gere a autorização. As retenções do contrato são calculadas e os descontos da medição também saem do valor pago:

> **Conta do pagamento**
> Valor bruto da medição
> (−) retenções do contrato (caução, ISS, INSS, IR, PIS/COFINS/CSLL)
> (−) descontos (adiantamento, alimentação, EPI)
> **= líquido a pagar**
> , que vai para a conta a pagar.

Autorizações dentro do valor de dispensa são aprovadas automaticamente; as demais seguem para a fila de aprovações. A caução é liberada ao encerrar o contrato, também por autorização.

# 7 Propostas e contratos

A proposta é o preço apresentado ao cliente para executar ou acompanhar uma obra. Quando o cliente aceita, o sistema gera o contrato e os lançamentos a receber.

## Os cinco tipos

| Tipo | Quando usar | Como é cobrado |
|---|---|---|
| **Acompanhamento de obra** | Acompanhar a execução para o cliente | Honorário mensal fixo, ou percentual do valor da obra dividido pelos meses |
| **Administração de obra** | Administrar a obra em nome do cliente | Taxa sobre o custo direto ou sobre o valor da obra, em parcelas mensais |
| **Contrato de preço global** | Executar a obra inteira por valor fechado | Marcos de pagamento; os percentuais somam 100% |
| **Contrato de preços unitários** | Executar serviços medidos por quantidade | Quantidades estimadas × preço unitário; o total é parcelado em meses |
| **Laudos técnicos** | Emitir laudos avulsos | Entrada na aceitação e saldo na entrega dos laudos |

## Origem do preço

Em **Puxar do orçamento da obra**, os valores vêm da obra escolhida: o valor da obra (custo direto com BDI), o custo direto e o preço de cada serviço. Em **Informar valores**, você digita os números. Laudos técnicos sempre usam valores informados.

Quando o preço vem do orçamento, o preço do serviço não pode ser alterado na proposta. Ele é recalculado pelo sistema.

# 7 Propostas e contratos

## Como gerar uma proposta

1. Abra `Comercial › Propostas` e clique em **Nova proposta**.
2. Escolha o **tipo**, o **cliente** e a **obra**. Para usar o orçamento, a obra é obrigatória.
3. Escolha a origem do preço e preencha os campos do tipo.
4. Confira a **prévia do cálculo** à direita: valor total e cronograma de recebimento.
5. **Salve o rascunho**. Ele pode ser editado até ser enviado.

Comercial › Propostas › Nova proposta

**Contrato de preço global · Puxar do orçamento da obra**

Data de assinatura: 01/11/2026 · Valor do contrato: R$ 1.200.000,00

| Marco | % | Dias | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Fundação concluída | 30% | 60 | 31/12/2026 | R$ 360.000,00 |
| Estrutura concluída | 40% | 150 | 31/03/2027 | R$ 480.000,00 |
| Entrega da obra | 30% | 300 | 28/08/2027 | R$ 360.000,00 |

# 7 Propostas e contratos

## Situação da proposta

Uma proposta passa por estas situações:

| Situação | O que significa | Quem pode |
|---|---|---|
| **Rascunho** | Em preparo. Pode ser editada. | Quem cria a proposta |
| **Enviada** | Entregue ao cliente, aguardando resposta. | Quem cria a proposta |
| **Aceita** | O cliente aceitou. Gera o contrato e os lançamentos a receber. | Dono e gestor |
| **Recusada** | O cliente recusou. | Dono e gestor |
| **Cancelada** | Retirada antes da aceitação. | Quem cria a proposta |

Só a proposta em rascunho pode ser editada. Use **Marcar como enviada** quando entregar ao cliente.

## Aceitação: contrato e contas a receber

Ao **registrar a aceitação**, o sistema faz tudo de uma vez:

1. Cria o **contrato** com o cliente, com número próprio.
2. Cria o **lançamento a receber** no financeiro, com as parcelas do cronograma da proposta.
3. Aponta a receita na **conta de receita** do plano de contas e no centro de custo da obra, quando houver obra.
4. Marca a proposta como **Aceita**.

> **Se algo falhar, nada é gravado.**
> A aceitação só acontece por completo. Se faltar uma conta de receita no plano de contas, ou se o cronograma tiver parcela zerada, o sistema mostra o motivo e nada é criado.

Acompanhe o recebimento em `Financeiro › Contas a pagar e receber`. As parcelas aparecem como receita do cliente, com a mesma data e valor da proposta.

> **Antes de aceitar, confira**
> Uma proposta aceita não volta a rascunho nem pode ser cancelada pela tela de propostas. Confira valores, marcos, parcelas e o cliente antes de registrar a aceitação.

# 8 Financeiro

O financeiro guarda o que a empresa deve, o que vai receber, o dinheiro nas contas e a classificação de cada despesa.

## Plano de contas

O plano de contas organiza receitas e despesas em **categorias** e **contas**. A categoria aparece junto da conta, por exemplo `3 · Despesas › 3.7 · Serviços terceirizados`. Só as contas que aceitam lançamento podem ser escolhidas nos documentos.

## Lançamentos e contas a pagar e a receber

Cada despesa ou receita gera um lançamento, com categoria, centro de custo, obra e competência. Os lançamentos podem ser parcelados. Para dar baixa numa parcela, informe a data do pagamento e a conta bancária.

## Bancos e caixa

Cadastre cada conta bancária e o caixa. Os saldos têm acesso restrito.

## Conciliação do extrato (OFX)

1. Baixe o extrato em formato **OFX** no internet banking.
2. Importe o arquivo em `Financeiro › Conciliação OFX`, escolhendo a conta bancária.
3. Concilie cada linha com a conta correspondente, ou marque como **ignorada** (tarifas, por exemplo). As linhas ignoradas ficam na aba própria.

> **Conciliação semanal**
> Concilie o extrato pelo menos uma vez por semana. Assim, o saldo do sistema fica igual ao do banco.

# 9 Gerencial

Os números da empresa para decidir: resultado, caixa, andamento das obras e o que está esperando aprovação.

O menu **Gerencial** tem três submenus. Cada um reúne telas em abas:

| Submenu | Abas |
|---|---|
| **Gerencial Financeiro** | DRE gerencial e Fluxo de caixa |
| **Gerencial Obras** | Acompanhamento de obra (Curva S, SPI e CPI) e Produção por equipe |
| **Gerencial Administrativo** | Indicadores |

Fora dos submenus ficam **Relatórios gerais**, **Autorizações de pagamento** e **Aprovações**.

## DRE e fluxo de caixa

O DRE mostra receitas, custos e despesas por período, com as linhas do plano de contas. O custo das obras aparece como `(−) Custo de produção de obras`. O fluxo de caixa mostra entradas e saídas, e tem acesso restrito.

## Acompanhamento de obra e Curva S

Mostra, por obra, o previsto, o executado e o realizado mês a mês, com SPI e CPI (capítulo 3). Use na reunião mensal de obra para ver se cronograma e custo estão no caminho.

## Indicadores

Resumo da empresa: obras em andamento, medições pendentes, contratos e autorizações aguardando aprovação.

## Aprovações

A fila reúne o que está esperando aprovação, como pedidos, contratos, medições e autorizações de pagamento.

| Regra | Como funciona |
|---|---|
| **Padrão** | O dono aprova todos os valores. |
| **Alçada de administradores** | Administradores aprovam até o valor definido. Acima dele, só o dono. |
| **Dispensa** | Valores até o limite de dispensa são aprovados automaticamente. |

# 10 Administrativo

Os cadastros que alimentam os documentos: quem vende para a empresa, quem recebe dela, quem financia e quem trabalha nas obras.

### Clientes

Quem compra da construtora. Nome, documento, endereço e contato.

### Fornecedores

Quem vende materiais ou presta serviços. Usado nas cotações, pedidos e contratos.

### Credores

Quem recebe pagamentos que não são compras, como bancos, financiamentos e impostos.

### Colaboradores

Funcionários e operadores, com cargo, função e documentos.

## Preencher pela foto ou PDF

Em clientes, fornecedores, credores e colaboradores, o botão **Preencher pela foto ou PDF** lê o documento (cartão de CNPJ, contrato social, CNH e outros) e preenche o formulário.

1. Clique em *Preencher pela foto ou PDF* e escolha o arquivo (PDF ou foto, de até 10 MB).
2. Confira os campos preenchidos antes de salvar.
3. Salve pelo próprio formulário. Nada é gravado enquanto você não salvar.

**Sempre confira**

A leitura automática ajuda, mas quem salva é responsável pelo cadastro. Confira CNPJ, CPF, chave PIX e número da CNH.

# 11 Configurações

Dados da empresa, pessoas e acessos, backup e exportação.

## Manual de operação

Em `Configurações › Manual de operação`, baixe o PDF deste manual para consulta.

## Empresa

Razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, logo e dados que saem nos documentos impressos.

## Usuários e acessos


Cadastre cada pessoa com um perfil, ajuste os módulos e defina quem é **administrador**.

## Minha conta e mural de avisos

Em `Minha conta`, cada pessoa troca a própria senha. O **Mural de avisos** serve para recados à equipe.

## Backup da empresa (dono)

Na seção **Backup da empresa**, em `Configurações › Empresa`, o dono guarda uma cópia de todos os dados da construtora, com a data do momento. Clique em *Fazer backup agora*. Os backups ficam listados e podem ser baixados por 30 dias. Para **restaurar** um backup, é preciso apoio técnico.




## Exportação de dados

O botão *Baixar exportação (.zip)*, na mesma tela, gera um arquivo com os dados da empresa para consulta.

> **Backup e exportação não são a mesma coisa**
> O backup serve para restaurar a empresa. A exportação serve para consulta e **não restaura** o sistema.

# 12 Rotinas recomendadas

Poucos minutos por dia e uma reunião curta por semana mantêm os números em dia.

| Quando | O que fazer | Quem |
|---|---|---|
| **Todo dia** | Confira a fila de aprovações. Registre as solicitações, os pedidos e as notas fiscais recebidas. | Compras, gestor, dono |
| **Toda semana** | Concilie o extrato OFX. Registre a medição física das obras e confira o saldo a contratar das solicitações de serviço. | Financeiro, engenharia |
| **Todo mês** | Faça as medições de cada contrato e gere as autorizações de pagamento. Confira a Curva S e o DRE. Faça um backup da empresa. | Engenharia, administrativo, dono |
| **Ao encerrar contrato** | Confirme as medições e a liberação da caução. | Engenharia, dono |

**Reunião de obra**

Uma vez por semana, abra o acompanhamento de cada obra: o SPI mostra o atraso do cronograma e o CPI mostra se o gasto está dentro do executado.

# 13 Dúvidas frequentes

Problemas comuns e como resolver.

| O que acontece | O que fazer |
|---|---|
| A medição não aceita a quantidade. | A quantidade passa do saldo do contrato. Confira a quantidade executada. Se o contrato precisa de mais quantidade, faça um aditivo antes. |
| A solicitação de serviço não mostra o serviço. | Escolha a obra primeiro. Os serviços listados são os do orçamento da obra. Se o serviço não aparece, cadastre-o no orçamento. |
| A Curva S não mostra meses ou não atualiza. | Verifique se o planejamento tem atividades ligadas à EAP. A curva vai até o mês de hoje. |
| O desconto não aparece no pagamento. | Os descontos são somados quando a autorização é gerada. Confira os descontos na medição antes de gerar a autorização. |
| A leitura por foto ou PDF não funciona. | Confira se o arquivo é PDF ou foto e tem até 10 MB. Se a mensagem disser que a leitura não está configurada, procure o suporte. |
| Não consigo ver saldos ou o fluxo de caixa. | Esses dados têm acesso restrito. Peça ao dono para ajustar os módulos. |
| Preciso restaurar o backup da empresa. | A restauração é feita com apoio técnico. Informe a data do backup que deseja restaurar. |

# 14 Glossário

Os termos usados no sistema.

| Termo | Significado |
|---|---|
| **Alçada** | Até qual valor uma pessoa pode aprovar um pedido, contrato, medição ou autorização. |
| **Autorização de pagamento** | Documento que transforma uma medição em pagamento: bruto, retenções, descontos e líquido. |
| **Caução** | Parte de cada medição retida como garantia, que pode ser liberada ao encerrar o contrato. |
| **Categoria** | Grupo do plano de contas (por exemplo, 3.7 Serviços terceirizados). |
| **Centro de custo** | Onde a despesa é apropriada, normalmente a obra. |
| **Cotação** | Pedido de preços enviado a fornecedores, com o mapa para comparar as respostas. |
| **CPI** | Executado dividido pelo realizado. Abaixo de 1, o gasto está acima do executado. |
| **Curva S** | Gráfico mensal de previsto, executado e realizado da obra. |
| **Descontos** | Valores deduzidos do pagamento ao terceiro (adiantamento, alimentação, EPI). |
| **EAP** | Estrutura analítica da obra: etapas, subetapas e tarefas onde o orçamento é lançado. |
| **Medição** | Registro do que foi executado num período, por quantitativos, percentual ou valor. |
| **Orçado** | Quantidade ou custo previsto no orçamento da obra. |
| **Retenções** | Percentuais descontados de cada pagamento: caução, ISS, INSS, IR e PIS/COFINS/CSLL. |
| **Saldo a contratar** | Orçado menos o já contratado e o já medido de um serviço na obra. |
| **SPI** | Executado dividido pelo previsto. Abaixo de 1, a obra está atrasada. |
