agrega construtoras

Manual de operação

Engenharia, suprimentos, medições, financeiro e gerencial para construtoras e incorporadoras.

Versão 1.0 · outubro de 2026

Para dono, gestor, engenharia, orçamento, compras, financeiro, administrativo, vendas e almoxarife.

Sumário

Leia o capítulo 1 e siga a ordem do capítulo 2 para implantar o sistema. Depois, use o manual como consulta.

1 Primeiros passos
Acesso, perfis e o menu

2 Implantação
A ordem certa de cadastrar tudo

3 Engenharia
Obras, EAP e orçamento, planejamento e acompanhamento

4 Suprimentos
Solicitações, cotações, pedidos e contratos

5 Estoque
Estoques, saldo, etiquetas QR e saídas para a obra

6 Medições e pagamentos
Medições, descontos e autorizações de pagamento

7 Propostas e contratos
Cinco tipos de proposta, aceitação, contrato e contas a receber

8 Financeiro
Plano de contas, lançamentos, bancos e conciliação

9 Gerencial
DRE, fluxo de caixa, Curva S, indicadores e aprovações

10 Administrativo
Clientes, fornecedores, credores e colaboradores

11 Configurações
Empresa, usuários, backup e exportação

12 Rotinas recomendadas
O que fazer todo dia, toda semana e todo mês

13 Dúvidas frequentes
Problemas comuns e como resolver

14 Glossário
Os termos usados no sistema

1 Primeiros passos

O Agrega Construtoras funciona no navegador, no computador e no celular, sem instalar nada. Cada construtora enxerga só os próprios dados.

Acesso

1. Abra o endereço do Agrega informado pela sua empresa.
2. Entre com o **e-mail** e a **senha** cadastrados pelo dono ou por um administrador.
3. Troque a senha provisória na área `Minha conta`.

Perfis

O perfil indica a função de cada pessoa. O dono ou um administrador pode ajustar os módulos liberados para cada uma.

Dono

Acesso a tudo. Aprova todos os valores e define as regras de aprovação.

Gestor

Acompanha a gestão da empresa. Pode ser administrador e aprovar até o limite definido.

Engenheiro de obra

Trabalha nas obras da engenharia e nas medições dos contratos.

Orçamentista

Monta a EAP, o orçamento e o planejamento das obras.

Comprador

Solicitações, cotações, pedidos e contratos de suprimentos.

Financeiro

Lançamentos, contas, bancos, conciliação e relatórios financeiros.

Administrativo

Cadastros de clientes, fornecedores, credores e colaboradores.

Vendedor

Módulo comercial: vendas da empresa.

Almoxarife

Só Suprimentos › Estoque: estoques, etiquetas QR e saídas para a obra.

Módulos por pessoa

Em `Configurações › Usuários e acessos` é possível marcar os módulos que cada pessoa vê. O menu mostra só os módulos liberados.

Dados restritos

Saldos bancários e fluxo de caixa só aparecem para quem tem acesso a eles. Peça ao dono para ajustar, se precisar.

1 Menu por módulos

O menu muda conforme os módulos liberados para cada pessoa. Os módulos ficam sempre na mesma ordem.

Menu por módulos

No computador, o menu fica à esquerda e mostra os módulos. Clique no módulo para abrir os itens. No celular, use o menu da barra de baixo.

Módulo	O que tem dentro
Engenharia	Obras, insumos, serviços, EAP e orçamento, planejamento, acompanhamento e relatórios
Suprimentos	Solicitações de compra e de serviços, cotações, pedidos, contratos, medições e estoque
Financeiro	Contas a pagar e a receber, lançamentos, bancos e caixa, conciliação OFX, plano de contas
Comercial	Propostas de obra, vendas e relatórios comerciais
Gerencial	DRE, fluxo de caixa, Curva S, indicadores, aprovações e autorizações de pagamento
Administrativo	Clientes, fornecedores, credores e colaboradores
Configurações	Empresa, usuários e acessos, mural de avisos, minha conta, relatórios de uso. Fica sempre por último.

2 Implantação

Siga esta ordem na primeira vez. Cada etapa usa informações da anterior: a obra precisa existir antes do orçamento, e o orçamento antes da solicitação de serviços.

Empresa → Usuários → Plano de contas → Cadastros → Obra → EAP e orçamento → Planejamento → Bancos

1. **Empresa.** Em `Configurações › Empresa`, confira razão social, CNPJ, endereço e logo. Esses dados aparecem nos documentos impressos.
2. **Usuários.** Em `Configurações › Usuários e acessos`, cadastre cada pessoa com o perfil certo e ajuste os módulos, se precisar.
3. **Plano de contas.** Em `Financeiro › Plano de contas`, revise as categorias (por exemplo, 3.7 Serviços terceirizados). Elas são usadas nos lançamentos e nas solicitações de serviço.
4. **Cadastros.** Cadastre clientes, fornecedores, credores e colaboradores em `Administrativo`. A leitura por foto ou PDF ajuda (capítulo 10).
5. **Obra.** Em `Engenharia › Obras`, cadastre a obra com código, nome, endereço e centro de custo.
6. **Insumos e serviços.** Cadastre os insumos e serviços da obra em `Engenharia`.
7. **EAP e orçamento.** Monte a estrutura da obra (etapas, subetapas e tarefas) e lance a quantidade de cada serviço. Na tarefa, use **Serviço da obra** com a busca para achar o serviço pelo código ou pela descrição.
8. **Planejamento.** Cadastre as atividades ligadas à EAP, com datas e predecessoras. O planejamento alimenta a Curva S.
9. **Bancos e caixa.** Cadastre as contas bancárias e o caixa em `Financeiro › Bancos e caixa`.
10. **Regras de aprovação.** Em `Gerencial › Aprovações`, defina até qual valor os administradores aprovam e quais valores dispensam aprovação.

> **Antes de lançar movimentos**
> Confirme o plano de contas e o orçamento da obra. Solicitações, contratos e medições usam as categorias e as quantidades do orçamento.

3 Engenharia


A engenharia organiza a obra: o que será feito (EAP e orçamento), quando (planejamento) e quanto já foi executado (acompanhamento).

Obras

Cada obra tem código, nome, endereço e centro de custo, usado para apropriar as despesas.

EAP e orçamento

A EAP divide a obra em níveis: **etapa**, **subetapa** e **tarefa**. Cada linha folha recebe os serviços do orçamento, com a quantidade e o custo calculado a partir da composição de insumos. O BDI é aplicado sobre o custo direto.



Planejamento

Cadastre as atividades ligadas às linhas da EAP, com início, duração e predecessoras. O sistema calcula as datas a partir da cadeia de predecessoras. O custo de cada linha é distribuído ao longo das datas da atividade: essa distribuição é o **previsto** da Curva S.

3 Engenharia (continuação)

Cadastro de insumo

Em `Insumos › Novo insumo`, escolha a **tabela** que vai receber o item. O código é gerado sozinho, na sequência da tabela (ex.: INS-0001).

- **Preço.** Escolha *Não registrar agora* ou *Informar valor*. O preço pode ficar para depois.
- **Unidades de compra.** Se o insumo é orçado numa unidade e comprado em outra, cadastre a unidade de compra e quantas unidades do orçamento cabem nela. Ex.: aço orçado em kg e comprado em barra: 1 barra = 46,2 kg.

Na obra, em `Engenharia › Obras › Insumos`, clique em **Editar** no insumo para cadastrar ou corrigir as unidades de compra só daquela obra. A tabela de referência não muda. As unidades aparecem na solicitação de compra, no campo **Unidade do pedido**.

Depois da primeira compra, o preço pode vir da nota mais recente. Em `Engenharia › Tabelas de referência`, na linha do insumo de uma tabela própria, use **Usar última compra**. O sistema converte o valor para a unidade do cadastro.

Acompanhamento de obra

Registre as medições físicas por data, em percentual ou em quantidade executada, por linha folha da EAP. O valor executado é o percentual da linha multiplicado pelo custo da linha.

Indicadores

SPI

= executado ÷ previsto. Abaixo de 1, a obra está atrasada em relação ao planejado.

CPI

= executado ÷ realizado (despesas confirmadas). Abaixo de 1, a obra gasta mais do que o executado.

Curva S

Mostra previsto, executado e realizado mês a mês. A curva vai até o mês de hoje, ou até o fim do planejamento se ele for depois. Executado e realizado só aparecem até hoje.

Tabelas de referência e relatórios

As tabelas de referência trazem insumos e composições de preços. Copie para a obra só o que for usar e ajuste os preços sem alterar a tabela original. Os relatórios da obra ficam em `Engenharia › Relatórios`.

4 Suprimentos

Do pedido de compra ou de serviço até o contrato. Cada etapa tem registro próprio.

Solicitação → Cotação → Pedido ou contrato → Medição ou recebimento → Autorização → Contas a pagar

Solicitação de compra (insumos)


Escolha a obra, a data e a data em que o material é necessário. Use **Buscar insumo** para filtrar pelo código ou parte da descrição. Adicione os insumos com a quantidade na unidade do item.

Sempre aparece o campo **Unidade do pedido**, com a unidade do orçamento e as outras unidades de compra cadastradas para o insumo. Digite a quantidade na unidade escolhida (ex.: 2 barras) e confira o equivalente na unidade do orçamento (ex.: 92,4 kg). O pedido, a cotação e a nota seguem a unidade escolhida. A entrada no estoque é convertida para a unidade do orçamento.

Use **Salvar** para guardar a solicitação com os insumos já incluídos. Ela fica **aberta** em Solicitações: você pode sair, voltar, incluir mais insumos (**Editar**) e, quando terminar, clicar em **Registrar solicitação** no detalhe. Só o Registrar envia a solicitação para cotação. Se você sair da tela com insumos não salvos, o sistema pede confirmação.

Solicitação de serviços

Serve para contratar serviços de terceiros. Escolha a obra, a **categoria** (do plano de contas, por exemplo 3.7 Serviços terceirizados) e o serviço cadastrado no orçamento da obra. Use **Buscar serviço** para filtrar pelo código ou parte da descrição. Ao escolher o serviço, o sistema mostra a unidade ao lado da quantidade e a referência da obra:



O **saldo a contratar** é o orçado menos o já contratado e o já medido, na mesma unidade do serviço. Contratos cancelados não entram nessa conta.

Cotações

1. **Criar a cotação** a partir da solicitação e envie aos fornecedores.
2. **Registrar as respostas.** Para cada fornecedor, informe o preço unitário de cada item, o prazo de entrega, a condição de pagamento, o frete, a validade e observações.
3. **Ler a proposta por PDF ou foto.** O botão de leitura preenche preços e condições a partir do documento. Os dados aparecem na tela para conferência e só são gravados quando você salva a resposta. Itens sem preço na proposta são avisados.
4. **Mapa de cotação.** Compare os preços lado a lado e escolha o fornecedor de cada item.

4 Suprimentos (continuação)

Pedidos de compra e contratos

Pedidos e contratos de serviço passam pela alçada de aprovação e ficam vigentes depois de aprovados.

Tipo de contrato	Como é medido
Por itens	Quantidade e preço unitário, por quantitativos ou percentual.
Global	Valor total, por valor ou percentual do contrato.
Retenções	Caução, ISS, INSS, IR e PIS/COFINS/CSLL, descontados de cada pagamento.

5 Estoque

O estoque mostra, para cada insumo da obra, quanto há disponível e em qual etapa da EAP. É isso que permite saber se um insumo pedido de novo é para a mesma etapa ou para outra.

Como o saldo entra

1. **Solicitação.** Cada insumo pedido já está apropriado a uma etapa da EAP.
2. **Pedido e nota.** O pedido de compra guarda essa apropriação. Quando a nota de compra é ligada ao pedido, cada item herda a obra, o insumo da obra e a etapa.
3. **Compra direta.** Se a nota não vem de um pedido, escolha em cada item do lançamento da nota a **obra**, o **insumo da obra**, a **etapa da EAP** e, se quiser, o **estoque de recebimento** (por padrão, o Recebimento da obra).
4. **Confirmação.** Ao confirmar a nota, cada item com apropriação completa entra no estoque escolhido e recebe uma **etiqueta com QR code**. Item sem obra, insumo ou etapa não entra no estoque e não gera etiqueta.

5 Estoque (continuação)

Estoques

Em `Suprimentos › Estoque`, clique em **Novo estoque**. Informe o nome e, se o estoque for de uma obra, escolha a **obra** a que ele pertence; sem obra, ele é um estoque geral. O código (EST-0001, EST-0002...) é dado automaticamente. Cada obra tem o estoque de **Recebimento**, que recebe as notas e não pode ser desativado. Os outros servem para organizar o material, como almoxarifado ou canteiro. Use **Desativar** para tirar um estoque de uso sem apagá-lo.

Saldo

Escolha a obra no topo da tela. A lista mostra o saldo de cada insumo. Clique no insumo para ver quanto há em cada estoque e etapa. O saldo é a soma das entradas menos as saídas daquela etapa.

Suprimentos › Estoque · obra 0012

Insumo	Saldo	Apropriação (etapa)
Cimento CP-II 50 kg	180 sc	Recebimento · 1.2.1 Fundação: 120 · 2.1.3 Alvenaria: 60

Na solicitação de insumos

Ao escolher um insumo na solicitação, o sistema mostra se ele já está em estoque, quanto há em cada etapa e quanto há na etapa escolhida. Assim você decide se pede de novo ou usa o que já existe.

> **Só o que tem apropriação entra**
> Notas de compra sem obra, insumo ou etapa não aparecem no saldo. Confira o lançamento da nota antes de confirmar.

5 Estoque (saídas)

Etiquetas QR

Cada item recebido gera uma etiqueta com QR code, com o insumo, a obra, a etapa, a data e o estoque. As etiquetas ficam em `Suprimentos › Estoque › Etiquetas (QR)`, onde também é possível imprimi-las. A saída de material é sempre feita lendo a etiqueta do insumo; não existe mais saída por quantidade digitada.

Saída de material

1. **Abra a saída.** Em Suprimentos › Estoque, escolha a obra e vá até **Saída de material**.
2. **Colaborador.** Escolha quem pegou o material. A lista traz os colaboradores cadastrados em `Administrativo › Colaboradores`.
3. **Etapa e dados.** Escolha a etapa da EAP, a data e, se precisar, uma observação.
4. **Leia a etiqueta.** Use a câmera (Ler QR com a câmera) ou digite o código. O sistema mostra o insumo e o saldo. Não aceita etiqueta de outra obra, sem saldo ou de outra etapa.
5. **Quantidade e registro.** Informe quanto sai de cada insumo e registre. A saída recebe um número (SAI-0001…) e o saldo da etiqueta diminui. Quem registra, o almoxarife, fica gravado como quem entregou.

Colaboradores

Quem retira material é um colaborador do cadastro do **Administrativo**; não há cadastro separado no estoque. Quem deixa a empresa deve ser desativado no cadastro de colaboradores: some da lista de saída, mas o histórico fica.

Transferir entre estoques

Para mover material de um estoque para outro, use **Transferir entre estoques**: insumo, etapa, origem, destino, quantidade e data. A transferência não gera etiqueta nova, e a etiqueta continua ligada ao estoque de origem.


> **Prefira receber no estoque certo**
> Como a etiqueta não muda na transferência, o ideal é escolher o estoque certo ao receber a nota, e não transferir depois.

6 Medições e pagamentos

A medição registra o que foi executado no período. Aprovada a medição, a autorização de pagamento calcula o valor líquido a pagar.

Nova medição

1. Escolha o **contrato**, o período medido e a data da medição.
2. Escolha como medir. Em contrato **por itens**, use `Quantitativos` (quantidade executada de cada serviço) ou `% do contratado` (um percentual aplicado a todos os serviços). Em contrato **global**, informe o valor ou o percentual.
3. Se houver valores a deduzir do pagamento ao terceiro, informe-os em **Descontos**: adiantamento, alimentação, EPI e outros. Cada desconto tem descrição e valor.
4. **Salve** e envie para aprovação.

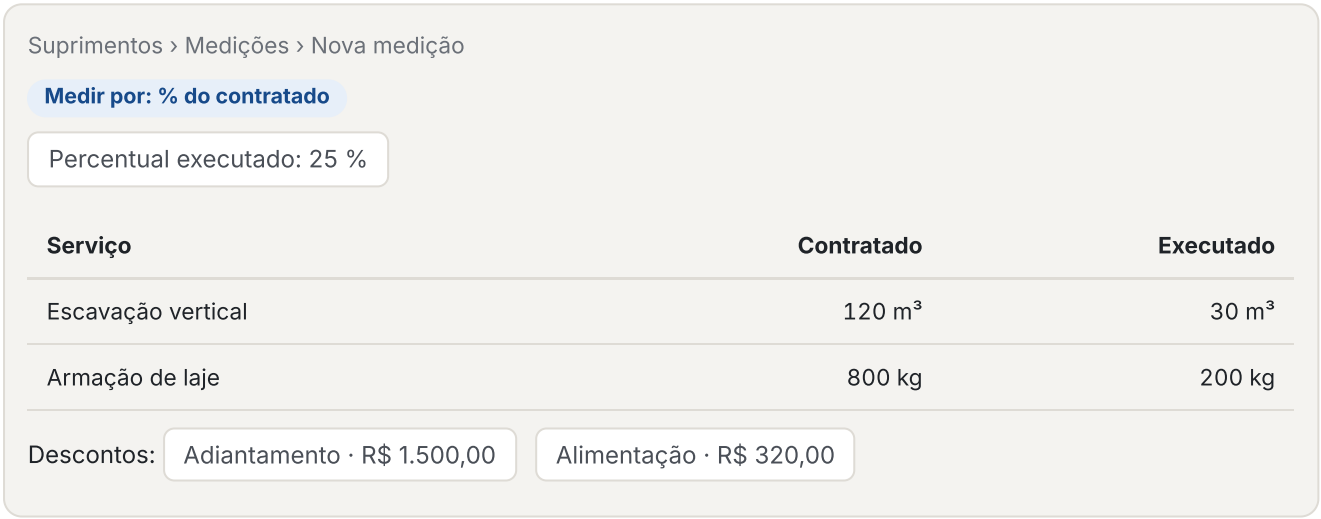

Aprovação

A medição enviada entra na fila de aprovações (*Gerencial › Aprovações*). Quem tem alçada aprova. Confira quantidades, percentuais e descontos antes de enviar.

Autorização de pagamento

A partir da medição, gere a autorização. As retenções do contrato são calculadas e os descontos da medição também saem do valor pago:

> **Conta do pagamento**
> Valor bruto da medição
> (−) retenções do contrato (caução, ISS, INSS, IR, PIS/COFINS/CSLL)
> (−) descontos (adiantamento, alimentação, EPI)
> **= líquido a pagar**
> , que vai para a conta a pagar.

Autorizações dentro do valor de dispensa são aprovadas automaticamente; as demais seguem para a fila de aprovações. A caução é liberada ao encerrar o contrato, também por autorização.

7 Propostas e contratos

A proposta é o preço apresentado ao cliente para executar ou acompanhar uma obra. Quando o cliente aceita, o sistema gera o contrato e os lançamentos a receber.

Os cinco tipos

Tipo	Quando usar	Como é cobrado
Acompanhamento de obra	Acompanhar a execução para o cliente	Honorário mensal fixo, ou percentual do valor da obra dividido pelos meses
Administração de obra	Administrar a obra em nome do cliente	Taxa sobre o custo direto ou sobre o valor da obra, em parcelas mensais
Contrato de preço global	Executar a obra inteira por valor fechado	Marcos de pagamento; os percentuais somam 100%
Contrato de preços unitários	Executar serviços medidos por quantidade	Quantidades estimadas × preço unitário; o total é parcelado em meses
Laudos técnicos	Emitir laudos avulsos	Entrada na aceitação e saldo na entrega dos laudos

Origem do preço

Em **Puxar do orçamento da obra**, os valores vêm da obra escolhida: o valor da obra (custo direto com BDI), o custo direto e o preço de cada serviço. Em **Informar valores**, você digita os números. Laudos técnicos sempre usam valores informados.

Quando o preço vem do orçamento, o preço do serviço não pode ser alterado na proposta. Ele é recalculado pelo sistema.

7 Propostas e contratos

Como gerar uma proposta

1. Abra `Comercial › Propostas` e clique em **Nova proposta**.
2. Escolha o **tipo**, o **cliente** e a **obra**. Para usar o orçamento, a obra é obrigatória.
3. Escolha a origem do preço e preencha os campos do tipo.
4. Confira a **prévia do cálculo** à direita: valor total e cronograma de recebimento.
5. **Salve o rascunho**. Ele pode ser editado até ser enviado.

Comercial › Propostas › Nova proposta

Contrato de preço global · Puxar do orçamento da obra

Data de assinatura: 01/11/2026 · Valor do contrato: R$ 1.200.000,00

Marco	%	Dias	Vencimento	Valor
Fundação concluída	30%	60	31/12/2026	R$ 360.000,00
Estrutura concluída	40%	150	31/03/2027	R$ 480.000,00
Entrega da obra	30%	300	28/08/2027	R$ 360.000,00

7 Propostas e contratos

Situação da proposta

Uma proposta passa por estas situações:

Situação	O que significa	Quem pode
Rascunho	Em preparo. Pode ser editada.	Quem cria a proposta
Enviada	Entregue ao cliente, aguardando resposta.	Quem cria a proposta
Aceita	O cliente aceitou. Gera o contrato e os lançamentos a receber.	Dono e gestor
Recusada	O cliente recusou.	Dono e gestor
Cancelada	Retirada antes da aceitação.	Quem cria a proposta

Só a proposta em rascunho pode ser editada. Use **Marcar como enviada** quando entregar ao cliente.

Aceitação: contrato e contas a receber

Ao **registrar a aceitação**, o sistema faz tudo de uma vez:

1. Cria o **contrato** com o cliente, com número próprio.
2. Cria o **lançamento a receber** no financeiro, com as parcelas do cronograma da proposta.
3. Aponta a receita na **conta de receita** do plano de contas e no centro de custo da obra, quando houver obra.
4. Marca a proposta como **Aceita**.

> **Se algo falhar, nada é gravado.**
> A aceitação só acontece por completo. Se faltar uma conta de receita no plano de contas, ou se o cronograma tiver parcela zerada, o sistema mostra o motivo e nada é criado.

Acompanhe o recebimento em `Financeiro › Contas a pagar e receber`. As parcelas aparecem como receita do cliente, com a mesma data e valor da proposta.

> **Antes de aceitar, confira**
> Uma proposta aceita não volta a rascunho nem pode ser cancelada pela tela de propostas. Confira valores, marcos, parcelas e o cliente antes de registrar a aceitação.

8 Financeiro

O financeiro guarda o que a empresa deve, o que vai receber, o dinheiro nas contas e a classificação de cada despesa.

Plano de contas

O plano de contas organiza receitas e despesas em **categorias** e **contas**. A categoria aparece junto da conta, por exemplo `3 · Despesas › 3.7 · Serviços terceirizados`. Só as contas que aceitam lançamento podem ser escolhidas nos documentos.

Lançamentos e contas a pagar e a receber

Cada despesa ou receita gera um lançamento, com categoria, centro de custo, obra e competência. Os lançamentos podem ser parcelados. Para dar baixa numa parcela, informe a data do pagamento e a conta bancária.

Bancos e caixa

Cadastre cada conta bancária e o caixa. Os saldos têm acesso restrito.

Conciliação do extrato (OFX)

1. Baixe o extrato em formato **OFX** no internet banking.
2. Importe o arquivo em `Financeiro › Conciliação OFX`, escolhendo a conta bancária.
3. Concilie cada linha com a conta correspondente, ou marque como **ignorada** (tarifas, por exemplo). As linhas ignoradas ficam na aba própria.

> **Conciliação semanal**
> Concilie o extrato pelo menos uma vez por semana. Assim, o saldo do sistema fica igual ao do banco.

9 Gerencial

Os números da empresa para decidir: resultado, caixa, andamento das obras e o que está esperando aprovação.

O menu **Gerencial** tem três submenus. Cada um reúne telas em abas:

Submenu	Abas
Gerencial Financeiro	DRE gerencial e Fluxo de caixa
Gerencial Obras	Acompanhamento de obra (Curva S, SPI e CPI) e Produção por equipe
Gerencial Administrativo	Indicadores

Fora dos submenus ficam **Relatórios gerais**, **Autorizações de pagamento** e **Aprovações**.

DRE e fluxo de caixa

O DRE mostra receitas, custos e despesas por período, com as linhas do plano de contas. O custo das obras aparece como `(−) Custo de produção de obras`. O fluxo de caixa mostra entradas e saídas, e tem acesso restrito.

Acompanhamento de obra e Curva S

Mostra, por obra, o previsto, o executado e o realizado mês a mês, com SPI e CPI (capítulo 3). Use na reunião mensal de obra para ver se cronograma e custo estão no caminho.

Indicadores

Resumo da empresa: obras em andamento, medições pendentes, contratos e autorizações aguardando aprovação.

Aprovações

A fila reúne o que está esperando aprovação, como pedidos, contratos, medições e autorizações de pagamento.

Regra	Como funciona
Padrão	O dono aprova todos os valores.
Alçada de administradores	Administradores aprovam até o valor definido. Acima dele, só o dono.
Dispensa	Valores até o limite de dispensa são aprovados automaticamente.

10 Administrativo

Os cadastros que alimentam os documentos: quem vende para a empresa, quem recebe dela, quem financia e quem trabalha nas obras.

Clientes

Quem compra da construtora. Nome, documento, endereço e contato.

Fornecedores

Quem vende materiais ou presta serviços. Usado nas cotações, pedidos e contratos.

Credores

Quem recebe pagamentos que não são compras, como bancos, financiamentos e impostos.

Colaboradores

Funcionários e operadores, com cargo, função e documentos.

Preencher pela foto ou PDF

Em clientes, fornecedores, credores e colaboradores, o botão **Preencher pela foto ou PDF** lê o documento (cartão de CNPJ, contrato social, CNH e outros) e preenche o formulário.

1. Clique em *Preencher pela foto ou PDF* e escolha o arquivo (PDF ou foto, de até 10 MB).
2. Confira os campos preenchidos antes de salvar.
3. Salve pelo próprio formulário. Nada é gravado enquanto você não salvar.

Sempre confira

A leitura automática ajuda, mas quem salva é responsável pelo cadastro. Confira CNPJ, CPF, chave PIX e número da CNH.

11 Configurações

Dados da empresa, pessoas e acessos, backup e exportação.

Manual de operação

Em `Configurações › Manual de operação`, baixe o PDF deste manual para consulta.

Empresa

Razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, logo e dados que saem nos documentos impressos.

Usuários e acessos


Cadastre cada pessoa com um perfil, ajuste os módulos e defina quem é **administrador**.

Minha conta e mural de avisos

Em `Minha conta`, cada pessoa troca a própria senha. O **Mural de avisos** serve para recados à equipe.

Backup da empresa (dono)

Na seção **Backup da empresa**, em `Configurações › Empresa`, o dono guarda uma cópia de todos os dados da construtora, com a data do momento. Clique em *Fazer backup agora*. Os backups ficam listados e podem ser baixados por 30 dias. Para **restaurar** um backup, é preciso apoio técnico.



Exportação de dados

O botão *Baixar exportação (.zip)*, na mesma tela, gera um arquivo com os dados da empresa para consulta.

> **Backup e exportação não são a mesma coisa**
> O backup serve para restaurar a empresa. A exportação serve para consulta e **não restaura** o sistema.

12 Rotinas recomendadas

Poucos minutos por dia e uma reunião curta por semana mantêm os números em dia.

Quando	O que fazer	Quem
Todo dia	Confira a fila de aprovações. Registre as solicitações, os pedidos e as notas fiscais recebidas.	Compras, gestor, dono
Toda semana	Concilie o extrato OFX. Registre a medição física das obras e confira o saldo a contratar das solicitações de serviço.	Financeiro, engenharia
Todo mês	Faça as medições de cada contrato e gere as autorizações de pagamento. Confira a Curva S e o DRE. Faça um backup da empresa.	Engenharia, administrativo, dono
Ao encerrar contrato	Confirme as medições e a liberação da caução.	Engenharia, dono

Reunião de obra

Uma vez por semana, abra o acompanhamento de cada obra: o SPI mostra o atraso do cronograma e o CPI mostra se o gasto está dentro do executado.

13 Dúvidas frequentes

Problemas comuns e como resolver.

O que acontece	O que fazer
A medição não aceita a quantidade.	A quantidade passa do saldo do contrato. Confira a quantidade executada. Se o contrato precisa de mais quantidade, faça um aditivo antes.
A solicitação de serviço não mostra o serviço.	Escolha a obra primeiro. Os serviços listados são os do orçamento da obra. Se o serviço não aparece, cadastre-o no orçamento.
A Curva S não mostra meses ou não atualiza.	Verifique se o planejamento tem atividades ligadas à EAP. A curva vai até o mês de hoje.
O desconto não aparece no pagamento.	Os descontos são somados quando a autorização é gerada. Confira os descontos na medição antes de gerar a autorização.
A leitura por foto ou PDF não funciona.	Confira se o arquivo é PDF ou foto e tem até 10 MB. Se a mensagem disser que a leitura não está configurada, procure o suporte.
Não consigo ver saldos ou o fluxo de caixa.	Esses dados têm acesso restrito. Peça ao dono para ajustar os módulos.
Preciso restaurar o backup da empresa.	A restauração é feita com apoio técnico. Informe a data do backup que deseja restaurar.

14 Glossário

Os termos usados no sistema.

Termo	Significado
Alçada	Até qual valor uma pessoa pode aprovar um pedido, contrato, medição ou autorização.
Autorização de pagamento	Documento que transforma uma medição em pagamento: bruto, retenções, descontos e líquido.
Caução	Parte de cada medição retida como garantia, que pode ser liberada ao encerrar o contrato.
Categoria	Grupo do plano de contas (por exemplo, 3.7 Serviços terceirizados).
Centro de custo	Onde a despesa é apropriada, normalmente a obra.
Cotação	Pedido de preços enviado a fornecedores, com o mapa para comparar as respostas.
CPI	Executado dividido pelo realizado. Abaixo de 1, o gasto está acima do executado.
Curva S	Gráfico mensal de previsto, executado e realizado da obra.
Descontos	Valores deduzidos do pagamento ao terceiro (adiantamento, alimentação, EPI).
EAP	Estrutura analítica da obra: etapas, subetapas e tarefas onde o orçamento é lançado.
Medição	Registro do que foi executado num período, por quantitativos, percentual ou valor.
Orçado	Quantidade ou custo previsto no orçamento da obra.
Retenções	Percentuais descontados de cada pagamento: caução, ISS, INSS, IR e PIS/COFINS/CSLL.
Saldo a contratar	Orçado menos o já contratado e o já medido de um serviço na obra.
SPI	Executado dividido pelo previsto. Abaixo de 1, a obra está atrasada.
