agrega construtoras

MANUAL DE OPERAÇÃO

Manual de operação

Engenharia, suprimentos, estoque e patrimônio, medições, financeiro e gerencial para construtoras e incorporadoras.

Versão 1.9 · novembro de 2026

Para dono, gestor, engenharia, orçamento, compras, almoxarife, financeiro, administrativo e vendas.

Sumário

Leia o capítulo 1 e siga a ordem do capítulo 2 para implantar o sistema. Depois, use o manual como consulta.

1 Primeiros passos
Acesso, perfis e o menu

2 Implantação
A ordem certa de cadastrar tudo

3 Engenharia
Obras, EAP e orçamento, planejamento, acompanhamento e visitas

4 Suprimentos
Solicitações, cotações, pedidos, recebimento e contratos

5 Estoque
Estoques, saldo, etiquetas QR e saídas para a obra

6 Ferramentas e equipamentos
Patrimônio, depreciação, retirada e devolução

7 Medições e pagamentos
Medições, descontos e autorizações de pagamento

8 Propostas e contratos
Cinco tipos de proposta, aceitação, contrato e contas a receber

9 Financeiro
Plano de contas, lançamentos, bancos e conciliação

10 Gerencial
DRE, fluxo de caixa, Curva S, indicadores e aprovações

11 Administrativo
Clientes, fornecedores, credores e colaboradores

12 Configurações
Empresa, usuários, backup e exportação

13 Rotinas recomendadas
O que fazer todo dia, toda semana e todo mês

14 Dúvidas frequentes e glossário
Problemas comuns e os termos usados no sistema

1 Primeiros passos

O Agrega Construtoras funciona no navegador, no computador e no celular, sem instalar nada. Cada construtora enxerga só os próprios dados.

Acesso

1. Abra o endereço do Agrega informado pela sua empresa.
2. Entre com o e-mail e a senha cadastrados pelo dono ou por um administrador.
3. Troque a senha provisória. No primeiro acesso, o sistema abre a tela **Minha conta** e só libera as demais telas depois da troca.

> **Primeiro acesso**
> Enquanto a senha inicial não for trocada, nenhuma outra tela fica disponível. Informe a senha atual, a nova senha (mínimo de 8 caracteres) e confirme.

Limites de obras e de usuários NOVO

O contrato da construtora define quantas obras ativas e quantos usuários ativos ela pode ter. Obra concluída e usuário desativado não contam. Ao passar do limite, o sistema recusa a criação ou a reativação e mostra o limite atual.

Durante o **período de teste**, valem 1 obra ativa e 3 usuários ativos, e cada perfil tem um único usuário ativo (por exemplo, um gestor, um almoxarife e um engenheiro de obra, além do dono). Terminado o teste, voltam a valer os limites do contrato. As datas do teste são combinadas com o comercial da Agrega.

Perfis

O perfil indica a função de cada pessoa. O dono ou um administrador pode ajustar os módulos liberados para cada uma.

Dono
Acesso a tudo. Aprova todos os valores e define as regras de aprovação.

Engenheiro de obra
Trabalha nas obras atribuídas a ele: EAP, medições, RDO, contratos das obras e retirada e devolução de ferramentas.

Comprador
Solicitações, cotações, pedidos e contratos de suprimentos.

Administrativo
Cadastros de clientes, fornecedores, credores e colaboradores.

Almoxarife
Estoque da obra, saídas por etiqueta, pedidos de compra das obras atribuídas (somente leitura, com preços) e ferramentas e equipamentos.

Gestor
Acompanha a gestão da empresa. Pode ser administrador e aprovar até o limite definido.

Orçamentista
Monta a EAP, o orçamento e o planejamento das obras.

Financeiro
Lançamentos, contas, bancos, conciliação e relatórios financeiros.

Vendedor
Módulo comercial: vendas da empresa.

Módulos por pessoa

Em Configurações › Usuários e acessos é possível marcar os módulos que cada pessoa vê. O menu mostra só os módulos liberados.

Obras atribuídas

Engenheiros de obra e almoxarifes só veem as obras que o dono ou o gestor marcou como responsabilidade deles, no cadastro da obra (Engenharia › Obras).

Dados restritos

Saldos bancários e fluxo de caixa só aparecem para quem tem acesso a eles. Peça ao dono para ajustar, se precisar.

1 Menu por módulos

O menu muda conforme os módulos liberados para cada pessoa. Os módulos ficam sempre na mesma ordem.

No computador, o menu fica à esquerda e mostra os módulos. Clique no módulo para abrir os itens. No celular, use o menu da barra de baixo.

MÓDULO	O QUE TEM DENTRO
Engenharia	Obras (de execução ou de acompanhamento por visitas), insumos, serviços, EAP e orçamento, planejamento, acompanhamento, visitas e relatórios
Suprimentos	Solicitações de compra e de serviços, cotações, pedidos, recebimento, contratos, medições, estoque e ferramentas e equipamentos
Financeiro	Contas a pagar e a receber, lançamentos, bancos e caixa, conciliação OFX, plano de contas
Comercial	Propostas de obra, vendas e relatórios comerciais
Gerencial	DRE, fluxo de caixa, Curva S, indicadores, aprovações e autorizações de pagamento
Administrativo	Clientes, fornecedores, credores e colaboradores
Configurações	Empresa, usuários e acessos, mural de avisos, minha conta, relatórios de uso. Fica sempre por último.

2 Implantação

Siga esta ordem na primeira vez. Cada etapa usa informações da anterior: a obra precisa existir antes do orçamento, e o orçamento antes da solicitação de serviços.

Empresa → Usuários → Plano de contas → Cadastros → Obra → EAP e orçamento → Planejamento → Bancos

1. **Empresa.** Em Configurações › Empresa, confira razão social, CNPJ, endereço e logo. Esses dados aparecem nos documentos impressos.
2. **Usuários.** Em Configurações › Usuários e acessos, cadastre cada pessoa com o perfil certo e ajuste os módulos, se precisar.
3. **Plano de contas.** Em Financeiro › Plano de contas, revise as categorias (por exemplo, 3.7 Serviços terceirizados). Elas são usadas nos lançamentos e nas solicitações de serviço.
4. **Cadastros.** Cadastre clientes, fornecedores, credores e colaboradores em Administrativo. A leitura por foto ou PDF ajuda (capítulo 11).
5. **Obra.** Em Engenharia › Obras, cadastre a obra com código, nome, endereço e centro de custo. Em **Responsáveis pela obra**, marque os engenheiros de obra e os almoxarifes que vão trabalhar nela.
6. **Insumos e serviços.** Cadastre os insumos e serviços da obra em Engenharia.
7. **EAP e orçamento.** Monte a estrutura da obra (etapas, subetapas e tarefas) e lance a quantidade de cada serviço.
8. **Planejamento.** Cadastre as atividades ligadas à EAP, com datas e predecessoras. O planejamento alimenta a Curva S.
9. **Bancos e caixa.** Cadastre as contas bancárias e o caixa em Financeiro › Bancos e caixa.
10. **Regras de aprovação.** Em Gerencial › Aprovações, defina até qual valor os administradores aprovam e quais valores dispensam aprovação.

> **Antes de lançar movimentos**
>
> Confirme o plano de contas e o orçamento da obra. Solicitações, contratos e medições usam as categorias e as quantidades do orçamento.

3 Engenharia

A engenharia organiza a obra: o que será feito (EAP e orçamento), quando (planejamento) e quanto já foi executado (acompanhamento).

Obras

Cada obra tem código, nome, endereço e centro de custo, usado para apropriar as despesas. Os responsáveis pela obra (engenheiros de obra e almoxarifes) também são marcados aqui. Só eles, e o dono e o gestor, veem a obra nas telas de estoque, pedidos e ferramentas.

Ao criar a obra, escolha o tipo: **Execução** (a obra completa, com EAP, orçamento, planejamento e estoque) ou **Acompanhamento** (acompanhada por visitas, ver a seção Visitas de acompanhamento).


EAP e orçamento

A EAP divide a obra em níveis: etapa, subetapa e tarefa. Cada linha folha recebe os serviços do orçamento, com a quantidade e o custo calculado a partir da composição de insumos. O BDI é aplicado sobre o custo direto.

EAP padrão ao criar a obra NOVO

Ao criar uma obra de execução, marque **Começar a EAP com as etapas padrão**. A planilha já nasce com 20 etapas, 39 subetapas e 74 tarefas, na mesma ordem da planilha de orçamento AltoQi Visus (Modelo Tipo 02): Serviços iniciais, Infraestrutura, Supraestrutura, Vedações, Instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e mecânicas, Movimentação de terra, Revestimentos, Pavimentações, Pintura, Esquadrias, Cobertura, Forro, Louças e metais, Paisagismo e Serviços complementares.

A EAP padrão traz só a estrutura: as tarefas nascem sem serviços. Lance a quantidade de cada serviço em cada tarefa, e renomeie, remova ou acrescente linhas à vontade. Se preferir, deixe a caixa desmarcada e monte a EAP do zero.



Planejamento

Em Engenharia › Planejamento, o planejamento tem cinco abas. A estrutura segue a EAP do orçamento: etapas e subetapas agrupam as tarefas e podem ser expandidas ou recolhidas pelo botão ▸ ao lado do nome.

- **Planejamento.** Clique em Atualizar pela EAP para criar uma atividade para cada tarefa nova da EAP, com 1 dia. Ajuste início, duração e predecessora. Etapas e subetapas não recebem atividade: as datas delas são as das tarefas abaixo.
- **Gantt.** Uma barra por tarefa. A barra vazada de uma etapa vai do início ao fim das tarefas abaixo dela.
- **Equipes necessárias.** Trabalhadores por dia de cada tipo de mão de obra, no período escolhido.
- **Materiais necessários.** Só os insumos da classe Material, com a quantidade total e a data em que devem estar na obra.
- **Equipamentos.** Só os insumos da classe Equipamento, com a quantidade total e a data em que devem estar na obra.

Cada aba tem o botão Imprimir. No celular instalado na tela inicial, o botão abre a mesma tela numa aba do Safari; lá, toque em Compartilhar e escolha Imprimir ou Salvar em PDF. Os botões de edição não aparecem na impressão. As datas seguem a cadeia de predecessoras. O custo de cada linha é distribuído ao longo das datas da atividade: essa distribuição é o previsto da Curva S.

Grupos de insumos e de serviços NOVO

Em Engenharia › Grupos de insumos e Engenharia › Grupos de serviços, cadastre as famílias usadas para organizar a obra. Crie, renomeie ou exclua grupos. Não é possível ter dois grupos com o mesmo nome, mesmo que mudem as maiúsculas.

- **Criar grupos sugeridos.** O botão cria os grupos sugeridos para obra civil (15 em cada tela). Grupos que já existem com o mesmo nome são mantidos.
- **Na obra.** As abas Insumos e Serviços mostram os itens agrupados e recolhidos. Clique no nome do grupo para abrir. Ao buscar, os grupos com resultado abrem sozinhos.
- **Trocar o grupo.** Em cada linha, escolha o grupo na seleção Grupo de. Os itens sem grupo ficam em Sem grupo, no fim da lista.
- **Excluir um grupo** não apaga nada: os insumos ou serviços dele voltam para Sem grupo.

Painel da obra NOVO

O dono vê, na aba Obras do Painel, um resumo de cada obra: orçado, previsto até a data, executado (medições), realizado (despesas), saldo a executar, SPI e CPI. Também mostra a Curva S, o executado por etapa e a tabela de etapas.

- **Orçado.** É o custo direto da planilha. Logo abaixo aparecem o BDI da obra e o total com BDI, que é o valor da planilha.
- **SPI** = executado ÷ previsto até a data (abaixo de 1 indica atraso). **CPI** = executado ÷ realizado (abaixo de 1 indica custo acima do executado).
- **Adotar datas do planejamento.** Põe o início da obra na data da primeira atividade e a previsão de término na data da última atividade.

Diagrama de rede NOVO

Em Engenharia › Relatórios › Diagrama de rede, cada tarefa do planejamento é uma caixa ligada à sua predecessora. Etapas e subetapas não aparecem no diagrama. Início e Término marcam as extremidades da obra. O caminho crítico fica em vermelho, e a folga aparece nas tarefas que têm folga.

3 Engenharia (continuação)

Cadastro de insumo

Em Insumos › Novo insumo, escolha a tabela que vai receber o item. O código é gerado sozinho, na sequência da tabela (ex.: INS-0001).

- **Preço.** Escolha Não registrar agora ou Informar valor. O preço pode ficar para depois.
- **Unidades de compra.** Se o insumo é orçado numa unidade e comprado em outra, cadastre a unidade de compra e quantas unidades do orçamento cabem nela. Ex.: aço orçado em kg e comprado em barra: 1 barra = 46,2 kg.

Para corrigir um insumo da tabela própria, clique em Editar na linha dele. Obras que já copiaram o insumo não mudam sozinhas. Na obra, em Engenharia › Obras › Insumos, clique em Editar no insumo para cadastrar ou corrigir as unidades de compra só daquela obra.

Depois da primeira compra, o preço pode vir da nota mais recente. Em Engenharia › Tabelas de referência, na linha do insumo de uma tabela própria, use **Usar última compra**. O sistema converte o valor para a unidade do cadastro.

Acompanhamento de obra

Registre as medições físicas por data, em percentual ou em quantidade executada, por linha folha da EAP. O valor executado é o percentual da linha multiplicado pelo custo da linha.

Indicadores

INDICADOR	COMO É CALCULADO	LEITURA
SPI	Executado ÷ previsto	Abaixo de 1, a obra está atrasada em relação ao planejado.
CPI	Executado ÷ realizado (despesas confirmadas)	Abaixo de 1, a obra gasta mais do que o executado.

Curva S. Mostra previsto, executado e realizado mês a mês. A curva vai até o mês de hoje, ou até o fim do planejamento se ele for depois. Executado e realizado só aparecem até hoje.

Tabelas de referência e relatórios

As tabelas de referência trazem insumos e composições de preços. Copie para a obra só o que for usar e ajuste os preços sem alterar a tabela original. Os relatórios da obra ficam em Engenharia › Relatórios.

O **Calendário de produção** mostra a programação em formato de planner, por dia, semana, quinzena ou mês. Em cada dia, a atividade marca o início (▶), a continuação (faixa colorida) e o término (■). Uma atividade de um dia só recebe ◆.

3 Engenharia · Visitas de acompanhamento NOVO

Para obras que o engenheiro acompanha por visitas. Cada visita vira um relatório com fotos, anotações e a identidade da empresa.

Criar a obra de acompanhamento

Em Engenharia › Obras, clique em Nova obra e escolha o tipo Acompanhamento. Obras de acompanhamento não têm EAP, orçamento, planejamento nem estoque de recebimento, e por isso não aparecem nas telas que dependem desses cadastros.

Registrar uma visita

- **Número.** Cada visita da obra recebe um número automático, na sequência.
- **Data e responsável.** A data vem com o dia de hoje. Ajuste se a visita foi em outro dia.
- **Anotações.** Escreva o que foi observado: andamento, pendências e orientações.

Fotos da visita

Tire fotos pela câmera do celular ou escolha arquivos. Cada foto aceita uma legenda. Cada visita aceita até 40 fotos, de até 2 MB cada. As fotos são reduzidas automaticamente antes de enviar.

Atalhos no Modo campo

No Modo campo, o atalho **Visitas de acompanhamento** abre a lista de obras, e o atalho **Relatório de visita** leva direto ao relatório. Os dois aparecem para o dono, o gestor e o engenheiro de obra. O Modo campo também está no menu do sistema.

Relatório da visita

O relatório traz o logo e as cores da empresa, os dados da obra, a visita, as fotos com legendas e as anotações. No fim, há duas linhas de assinatura. A do responsável pela visita é assinada na tela do celular, pelo botão **Registrar assinatura do responsável** na própria visita. Digite o nome do responsável no campo da visita e assine: ao assinar, o sistema salva o nome junto com a visita. A do dono da obra é assinada pelo link que a tela da visita gera em **Gerar link para o dono assinar**: o dono abre o link, informa o nome e assina na tela, sem precisar de login. O link vale 30 dias, e gerar outro substitui o anterior. O relatório traz também um código de verificação, que é um resumo do conteúdo da visita no momento das assinaturas. Se o texto da visita ou as fotos mudarem depois, as assinaturas que deixam de conferir são removidas e precisam ser feitas de novo. Salve a visita antes de abrir o relatório, porque ele sai com os dados salvos. Para imprimir ou salvar em PDF, clique em Imprimir. O relatório não leva o rodapé da Agrega, então pode seguir direto para o cliente.

Para imprimir ou salvar o relatório em PDF, use o botão **Imprimir / salvar em PDF**. No celular instalado na tela inicial, o botão abre o relatório numa aba do Safari: toque em Compartilhar e escolha Imprimir ou Salvar em PDF.

> **Quem vê cada obra**
>
> O dono e o gestor veem todas as obras de acompanhamento. O engenheiro de obra vê apenas as obras em que foi marcado como responsável.

4 Suprimentos

Do pedido de compra ou de serviço até o contrato. Cada etapa tem registro próprio.

Solicitação → Cotação → Pedido ou contrato → Recebimento ou medição → Autorização → Contas a pagar

Solicitação de compra (insumos)


Escolha a obra, a data e a data em que o material é necessário. Use Buscar insumo para filtrar pelo código ou parte da descrição. Adicione os insumos com a quantidade na unidade do item.

Sempre aparece o campo **Unidade do pedido**, com a unidade do orçamento e as outras unidades de compra cadastradas para o insumo. Digite a quantidade na unidade escolhida (ex.: 2 barras) e confira o equivalente na unidade do orçamento (ex.: 92,4 kg). O pedido, a cotação e a nota seguem a unidade escolhida.

Use **Salvar** para guardar a solicitação com os insumos já incluídos. Só o **Registrar** envia a solicitação para cotação.

Solicitação de serviços

Serve para contratar serviços de terceiros. Escolha a obra, a categoria (do plano de contas, por exemplo 3.7 Serviços terceirizados) e o serviço cadastrado no orçamento da obra. Ao escolher o serviço, o sistema mostra a unidade e a referência da obra.



O saldo a contratar é o orçado menos o já contratado e o já medido, na mesma unidade do serviço. Contratos cancelados não entram nessa conta.

Excluir apropriação pendente NOVO

Em Solicitações, a seção Já apropriados e pendentes lista os insumos apropriados que ainda não foram pedidos. Se um insumo foi apropriado por engano, clique em Excluir na linha dele. O botão só aparece para insumos pendentes: se o insumo já foi solicitado ou comprado, a exclusão é recusada.

Cotações

1. Crie a cotação a partir da solicitação e envie aos fornecedores.
2. Registre as respostas. Para cada fornecedor, informe o preço unitário de cada item, o prazo de entrega, a condição de pagamento, o **frete**, a validade e observações.
3. Leia a proposta por PDF ou foto. Os dados aparecem para conferência e só são gravados quando você salva a resposta.
4. Mapa de cotação. Compare os preços lado a lado e escolha o fornecedor de cada item.

4 Suprimentos (continuação)

Pedidos de compra

Ao concluir a cotação, cada fornecedor escolhido gera um pedido de compra. O pedido precisa ser aprovado antes de ser enviado ao fornecedor. Quando o pedido é aprovado, ele vale para o recebimento.

Frete no pedido

O total do pedido já inclui o frete. Escolha a forma de frete no pedido:

FRETE POR	O QUE PREENCHER
CIF (incluso no preço)	Só o valor total do pedido, sem frete separado.
Fornecedor de transporte	Escolha a transportadora cadastrada e digite o valor do frete.
Transporte próprio	Digite o valor do frete, sem transportadora.

Recebimento com a nota fiscal

Ao receber o material, ligue a nota fiscal de compra ao pedido. Cada item da nota é ligado a um item do pedido, com a quantidade recebida. O sistema confere a nota com o pedido e **bloqueia a confirmação** da nota se houver divergência:

- item da nota que não está ligado a nenhum item do pedido;
- quantidade recebida maior que a quantidade do pedido, somando todas as notas do pedido;
- valor da nota diferente da quantidade recebida vezes o preço do pedido (tolerância de 0,5%).

> **Corrija antes de confirmar**
>
> A mensagem indica o item, o valor da nota e o valor do pedido. Ajuste a ligação ou a nota, e só depois confirme. A nota com divergência não entra no financeiro nem no estoque.

Cancelar e reabrir pedido NOVO

Um pedido cancelado libera a necessidade da obra, que volta a ficar pendente, desde que nenhum outro pedido a use. Se o pedido foi cancelado por engano e não tem nota ligada, clique em Reabrir pedido: ele volta a rascunho e a solicitação volta a ficar atendida. A reabertura é recusada se a solicitação já estiver em outra cotação ou em outro pedido ativo.

Conferência de unidades NOVO

Em Suprimentos › Conferência de unidades aparecem as linhas das notas cuja unidade do insumo é diferente da unidade do pedido. Informe quantas unidades do insumo cabem em uma unidade de compra (por exemplo, 1 barra = 12 metros). O fator fica gravado na linha da nota.

Vincular e dividir itens da nota NOVO

Na nota, o botão Vincular liga cada item a um item do pedido e informa a quantidade pedida. Quando a mesma linha da nota corresponde a apropriações diferentes, o botão Dividir separa a linha em duas, com a quantidade e o valor de cada parte. O botão Frota continua disponível para ligar o item a um veículo ou equipamento.

Quem vê o pedido

O almoxarife vê, em modo somente leitura, os pedidos aprovados (ou já enviados, recebidos e encerrados) que tenham itens de obras atribuídas a ele, com preços e valores. Ele confere o material no recebimento contra a nota. Não altera o pedido.

Contratos

Pedidos e contratos de serviço passam pela alçada de aprovação e ficam vigentes depois de aprovados.

TIPO DE CONTRATO	COMO É MEDIDO
Por itens	Quantidade e preço unitário, por quantitativos ou percentual.
Global	Valor total, por valor ou percentual do contrato.
Retenções	Caução, ISS, INSS, IR e PIS/COFINS/CSLL, descontados de cada pagamento.

5 Estoque

O estoque mostra, para cada insumo da obra, quanto há disponível e em qual etapa da EAP. É isso que permite saber se um insumo pedido de novo é para a mesma etapa ou para outra.

Como o saldo entra

1. **Solicitação.** Cada insumo pedido já está apropriado a uma etapa da EAP.
2. **Pedido e nota.** O pedido de compra guarda essa apropriação. Quando a nota de compra é ligada ao pedido, cada item herda a obra, o insumo da obra e a etapa.
3. **Compra direta.** Se a nota não vem de um pedido, escolha em cada item a obra, o insumo da obra, a etapa da EAP e, se quiser, o estoque de recebimento (por padrão, o Recebimento da obra).
4. **Despesa com estoque.** Um lançamento de despesa também pode dar entrada no estoque, da mesma forma (capítulo 9).
5. **Confirmação.** Cada item com apropriação completa entra no estoque escolhido e **recebe a sua etiqueta**. Item sem obra, insumo ou etapa não entra no estoque e não gera etiqueta.

5 Estoque (continuação)


Estoques

Em Suprimentos › Estoque, clique em Novo estoque. Informe o nome e, se o estoque for de uma obra, escolha a obra a que ele pertence; sem obra, ele é um estoque geral. O código (EST-0001, EST-0002...) é dado automaticamente.

Cada obra tem o estoque de Recebimento, que recebe as notas e não pode ser desativado. Os outros servem para organizar o material, como almoxarifado ou canteiro. Use Desativar para tirar um estoque de uso sem apagá-lo.

Saldo

Escolha a obra no topo da tela. A lista mostra o saldo de cada insumo. Clique no insumo para ver quanto há em cada estoque e etapa. O saldo é a soma das entradas menos as saídas daquela etapa.



Na solicitação de insumos. Ao escolher um insumo na solicitação, o sistema mostra se ele já está em estoque, quanto há em cada etapa e quanto há na etapa escolhida. Assim você decide se pede de novo ou usa o que já existe.

> **Só o que tem apropriação entra**
>
> Notas de compra sem obra, insumo ou etapa não aparecem no saldo. Confira o lançamento da nota antes de confirmar.

5 Estoque (etiquetas e saídas)

Unidade no saldo NOVO

Na tabela de saldo, a coluna Unidade permite ver o saldo e as saídas na unidade de compra cadastrada para o insumo (por exemplo, barra ou saco). A conversão é só de visualização: o estoque continua gravado na unidade do orçamento. As unidades de compra são cadastradas em Insumos da obra, no botão Editar do insumo.

Etiquetas QR ATUALIZADO

Toda entrada no estoque gera uma etiqueta com QR code: a de nota fiscal e a de despesa com estoque. A etiqueta traz o código do insumo, a descrição, a etapa, a obra, o estoque, a data de entrada e a quantidade.

- **O QR não muda.** Ele identifica aquela entrada no estoque. A etiqueta impressa continua válida nas saídas enquanto a entrada existir.
- **Se a entrada for cancelada** (nota ou lançamento cancelado), a etiqueta sai junto. Uma nova entrada gera um QR novo.

Imprimir as etiquetas

Em Suprimentos › Estoque, escolha a obra e clique em **Imprimir etiquetas**. A página abre com folhas A4 de 24 etiquetas (3 × 8, 70 × 37 mm). Use Somente com saldo para imprimir só as etiquetas que ainda têm material. Clique em Imprimir e escolha a impressora.

Saída de material

1. **Abra a saída.** Em Suprimentos › Estoque, escolha a obra e vá até Saída de material.
2. **Colaborador.** Escolha quem pegou o material. A lista traz os colaboradores cadastrados em Administrativo.
3. **Etapa e dados.** Escolha a etapa da EAP, a data e, se precisar, uma observação.
4. **Leia a etiqueta.** Use a câmera (Ler QR com a câmera) ou digite o código. O sistema mostra o insumo e o saldo. Não aceita etiqueta de outra obra, sem saldo ou de outra etapa.
5. **Quantidade e registro.** Informe quanto sai de cada insumo e registre. A saída recebe um número (SAI-0001...) e o saldo da etiqueta diminui. Quem registra, o almoxarife, fica gravado como quem entregou.

Colaboradores

Quem retira material é um colaborador do cadastro do Administrativo; não há cadastro separado no estoque. Quem deixa a empresa deve ser desativado no cadastro de colaboradores: some da lista de saída, mas o histórico fica.

Transferir entre estoques

Para mover material de um estoque para outro, use Transferir entre estoques: insumo, etapa, origem, destino, quantidade e data. A transferência não gera etiqueta nova, e a etiqueta continua ligada ao estoque de origem.

> **Prefira receber no estoque certo**
>
> Como a etiqueta não muda na transferência, o ideal é escolher o estoque certo ao receber a nota, e não transferir depois.

6 Ferramentas e equipamentos NOVO

O patrimônio da construtora: ferramentas e equipamentos próprios. Cada bem tem código, etiqueta QR e depreciação. Em Suprimentos › Ferramentas e equipamentos.

Cadastro do bem

Só o dono e o gestor cadastram ou alteram um bem. Clique em **Cadastrar bem** e preencha:

CAMPO	O QUE INFORMAR
Nome, marca e série	Como o bem é identificado. A série ajuda a diferenciar bens iguais.
Data e valor de aquisição	Quando e por quanto o bem foi comprado. É a base da depreciação.
Valor residual	O que se espera que o bem valha no fim da vida útil. Pode ser zero.
Vida útil (meses)	Por quantos meses o bem é depreciado.

O código (PAT-0001, PAT-0002...) é dado automaticamente.

Depreciação

A depreciação é linear: (valor de aquisição − valor residual) dividido pela vida útil, por mês. A tela mostra a depreciação mensal, a acumulada até hoje (com os meses já usados) e o valor contábil (o que ainda resta do bem). Um bem depreciado por completo mostra o valor residual.

SUPRIMENTOS › FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS · PAT-0001

Aquisição: 15/03/2026 · R$ 3.600,00 Vida útil: 36 meses (residual R$ 0,00)
Depreciação mensal: R$ 100,00 Acumulada: R$ 700,00 (7 de 36 meses) Valor contábil: R$ 2.900,00

Lançamento contábil

Por enquanto, a depreciação aparece na tela, mas não gera lançamento no financeiro. Se for preciso lançar a depreciação no centro de custo da obra, peça o ajuste ao suporte técnico.

6 Ferramentas e equipamentos (continuação)

Retirada e devolução

O almoxarife, o engenheiro de obra e o dono registram a retirada e a devolução. Quem não é dono só registra para as obras atribuídas a ele.

1. **Retirar.** Abra o bem (ou leia a etiqueta com o botão **Ler QR**), escolha a obra, informe quem está retirando e registre. O bem passa a estar em uso naquela obra.
2. **Devolver.** Abra o bem em uso, escolha o estado (Bom, disponível, ou Precisa de manutenção) e registre. O bem volta para o estoque de ferramentas ou vai para manutenção.

Situação do bem

SITUAÇÃO	SIGNIFICADO	QUEM MUDA
Disponível	Pode ser retirado.	Dono, gestor, ou ao devolver em bom estado
Em uso	Está numa obra, com um responsável.	Quem registra a retirada
Em manutenção	Não pode ser retirado até voltar.	Dono, gestor, ou ao devolver com defeito
Baixado	Saiu do patrimônio (perda, venda ou descarte). Fica no histórico.	Dono e gestor

Um bem em uso não muda de situação pelo cadastro: devolva antes. Cada retirada e devolução fica no histórico do bem, com a obra, quem retirou, o estado, a data, a observação e quem registrou.

Etiqueta QR do bem

Cada bem tem o seu QR, que não muda. Ele aparece na tela do bem. Para imprimir, clique em **Imprimir etiquetas** na tela de ferramentas e equipamentos: a folha A4 traz 24 etiquetas (3 × 8, 70 × 37 mm) com código, nome, marca e série. Bens baixados não entram na impressão.


> **A etiqueta não tem obra nem responsável**
>
> Esses dados mudam a cada retirada, então ficam só no cadastro. Por isso, a etiqueta não precisa ser reimpressa quando o bem muda de obra.

7 Medições e pagamentos

A medição registra o que foi executado no período. Aprovada a medição, a autorização de pagamento calcula o valor líquido a pagar.

Nova medição

1. Escolha o contrato, o período medido e a data da medição.
2. Escolha como medir. Em contrato por itens, use Quantitativos (quantidade executada de cada serviço) ou % do contratado (um percentual aplicado a todos os serviços). Em contrato global, informe o valor ou o percentual.
3. Se houver valores a deduzir do pagamento ao terceiro, informe-os em Descontos: adiantamento, alimentação, EPI e outros. Cada desconto tem descrição e valor.
4. Salve e envie para aprovação.

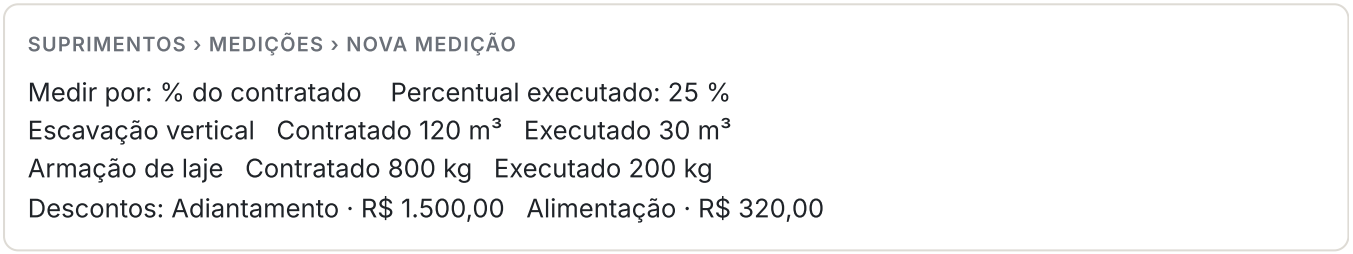

Aprovação

A medição enviada entra na fila de aprovações (Gerencial › Aprovações). Quem tem alçada aprova. Confira quantidades, percentuais e descontos antes de enviar.

Autorização de pagamento

A partir da medição, gere a autorização. As retenções do contrato são calculadas e os descontos da medição também saem do valor pago:

Valor bruto da medição
(−) retenções do contrato (caução, ISS, INSS, IR, PIS/COFINS/CSLL)
(−) descontos (adiantamento, alimentação, EPI)
= líquido a pagar, que vai para a conta a pagar.

Autorizações dentro do valor de dispensa são aprovadas automaticamente; as demais seguem para a fila de aprovações. A caução é liberada ao encerrar o contrato, também por autorização.

8 Propostas e contratos

A proposta é o preço apresentado ao cliente. Aceita, ela gera o contrato e os lançamentos a receber.

Os cinco tipos

TIPO	QUANDO USAR	COMO É COBRADO
Acompanhamento de obra	Acompanhar a execução para o cliente	Honorário mensal fixo, ou percentual do valor da obra dividido pelos meses
Administração de obra	Administrar a obra em nome do cliente	Taxa sobre o custo direto ou sobre o valor da obra, em parcelas mensais
Contrato de preço global	Executar a obra inteira por valor fechado	Marcos de pagamento; os percentuais somam 100%
Contrato de preços unitários	Executar serviços medidos por quantidade	Quantidades estimadas × preço unitário; o total é parcelado em meses
Laudos técnicos	Emitir laudos avulsos	Entrada na aceitação e saldo na entrega dos laudos

Origem do preço

Em Puxar do orçamento da obra, os valores vêm da obra: valor da obra (custo direto com BDI), custo direto e preço de cada serviço. Em Informar valores, você digita. Laudos técnicos sempre usam valores informados.

Como gerar uma proposta

1. Abra Comercial › Propostas e clique em Nova proposta.
2. Escolha o tipo, o cliente e a obra. Para usar o orçamento, a obra é obrigatória.
3. Escolha a origem do preço e preencha os campos do tipo.
4. Confira a prévia do cálculo à direita: valor total e cronograma de recebimento.
5. Salve o rascunho, que pode ser editado até ser enviado.

Situação da proposta

SITUAÇÃO	O QUE SIGNIFICA	QUEM PODE
Rascunho	Em preparo. Pode ser editada.	Quem cria a proposta
Enviada	Entregue ao cliente, aguardando resposta.	Quem cria a proposta
Aceita	O cliente aceitou. Gera o contrato e os lançamentos a receber.	Dono e gestor
Recusada	O cliente recusou.	Dono e gestor
Cancelada	Retirada antes da aceitação.	Quem cria a proposta

Obra da proposta NOVO

A obra criada para uma proposta fica Em orçamento, e o centro de custo dela fica inativo. Assim ela não polui os relatórios financeiros.

- **Proposta aceita.** A obra passa para Planejamento e o centro de custo fica ativo.
- **Proposta recusada ou cancelada.** A obra é arquivada: sai das listas de obras, mas os dados ficam guardados e o centro de custo é inativado.

Aceitação: contrato e contas a receber

Ao registrar a aceitação, o sistema cria o contrato, o lançamento a receber com as parcelas do cronograma e a receita no centro de custo da obra. Se algo falhar, nada é gravado. Uma proposta aceita não volta a rascunho: confira valores, parcelas e o cliente antes.

Ao aceitar a proposta de teste pelo link enviado pelo comercial, o período de teste começa no dia do aceite e dura os dias combinados na proposta.

9 Financeiro

O financeiro guarda o que a empresa deve, o que vai receber, o dinheiro nas contas e a classificação de cada despesa.

Plano de contas

O plano de contas organiza receitas e despesas em categorias e contas. A categoria aparece junto da conta, por exemplo 3 · Despesas › 3.7 · Serviços terceirizados. Só as contas que aceitam lançamento podem ser escolhidas nos documentos.

Lançamentos e contas a pagar e a receber

Cada despesa ou receita gera um lançamento, com categoria, centro de custo, obra e competência. Os lançamentos podem ser parcelados. Para dar baixa numa parcela, informe a data do pagamento e a conta bancária.

Despesa a partir de um pedido de compra NOVO

Ao lançar uma despesa avulsa, escolha **Preencher pelo pedido de compra aprovado**. A lista traz os pedidos aprovados que ainda não viraram despesa. Ao escolher um pedido:

- o fornecedor, a descrição e o valor total (com frete) vêm do pedido;
- o pedido fica ligado à despesa e sai da lista de pedidos disponíveis;
- se o pedido tiver material de estoque, os itens de estoque vêm preenchidos com a obra, o insumo da obra, a etapa e a descrição da solicitação de origem. Quantidade, unidade e valor são os comprados.

> **Não duplique a despesa**
> Um pedido com despesa lançada, ou com nota já lançada, não aparece de novo na lista. Para liberar o pedido, cancele o lançamento.

Entrada no estoque pela despesa

Em uma despesa avulsa, marque **Esta compra dá entrada no estoque da construtora** e preencha os itens, como numa nota. Cada item gera a sua etiqueta QR. Se o lançamento for cancelado, as entradas saem do estoque.

Ler a foto ou o PDF do documento NOVO

No formulário de despesa ou receita, clique em **Preencher pela foto ou PDF** e escolha a nota, o boleto, a fatura ou o recibo (até 10 MB). O sistema preenche:

- descrição, documento, data, valor e vencimento da parcela única ou da primeira;
- o fornecedor ou cliente, encontrado pelo CNPJ ou CPF nos cadastros.

Nada é salvo na leitura: confira e salve. Se a pessoa não estiver cadastrada, o sistema avisa. Com várias parcelas, ajuste o parcelamento. A categoria você escolhe.

Permuta como forma de pagamento NOVO

Permuta é uma forma de pagamento disponível em parcelas, vendas, autorizações de pagamento, notas, contratos e propostas, junto com PIX, boleto, transferência, cartão, dinheiro, cheque e débito automático.

Escolha Permuta quando o pagamento for feito com um bem ou direito, e não com dinheiro.

Bancos, caixa e conciliação (OFX)

Cadastre cada conta e o caixa; os saldos têm acesso restrito. Para conciliar, baixe o extrato OFX no internet banking, importe em Financeiro › Conciliação OFX, escolha a conta e concilie cada linha, ou marque como ignorada (tarifas, por exemplo). Faça isso pelo menos uma vez por semana.

10 Gerencial

Os números da empresa para decidir: resultado, caixa, andamento das obras e o que está esperando aprovação.

SUBMENU	TELAS EM ABAS
Gerencial Financeiro	DRE gerencial e Fluxo de caixa
Gerencial Obras	Acompanhamento de obra (Curva S, SPI e CPI) e Produção por equipe
Gerencial Administrativo	Indicadores

Fora dos submenus ficam Relatórios gerais, Autorizações de pagamento e Aprovações.

DRE e fluxo de caixa

O DRE mostra receitas, custos e despesas por período, com as linhas do plano de contas. O custo das obras aparece como (−) Custo de produção de obras. O fluxo de caixa mostra entradas e saídas, e tem acesso restrito.

Acompanhamento de obra e Curva S

Mostra, por obra, o previsto, o executado e o realizado mês a mês, com SPI e CPI. Use na reunião mensal de obra para ver se cronograma e custo estão no caminho.

Indicadores

Resumo da empresa: obras em andamento, medições pendentes, contratos e autorizações aguardando aprovação.

Aprovações

A fila reúne o que está esperando aprovação, como pedidos, contratos, medições e autorizações de pagamento.

REGRA	COMO FUNCIONA
Padrão	O dono aprova todos os valores.
Alçada de administradores	Administradores aprovam até o valor definido. Acima dele, só o dono.
Dispensa	Valores até o limite de dispensa são aprovados automaticamente.

11 Administrativo

Os cadastros que alimentam os documentos: quem vende para a empresa, quem recebe dela, quem financia e quem trabalha nas obras.

Clientes
Quem compra da construtora. Nome, documento, endereço e contato.

Fornecedores
Quem vende materiais ou presta serviços. Usado nas cotações, pedidos e contratos.

Credores
Quem recebe pagamentos que não são compras, como bancos, financiamentos e impostos.

Colaboradores
Funcionários e operadores, com cargo, função e documentos.

Preencher pela foto ou PDF

Em clientes, fornecedores, credores e colaboradores, o botão Preencher pela foto ou PDF lê o documento (cartão de CNPJ, contrato social, CNH e outros) e preenche o formulário.

1. Clique em Preencher pela foto ou PDF e escolha o arquivo (PDF ou foto, de até 10 MB).
2. Confira os campos preenchidos antes de salvar.
3. Salve pelo próprio formulário. Nada é gravado enquanto você não salvar.

> **Sempre confira**
> A leitura automática ajuda, mas quem salva é responsável pelo cadastro. Confira CNPJ, CPF, chave PIX e número da CNH.

12 Configurações

Dados da empresa, pessoas e acessos, backup e exportação.

Manual de operação

Em Configurações › Manual de operação, baixe o PDF deste manual para consulta.

Comercial do sistema (somente administrador)

Empresa

Razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, logo e dados que saem nos documentos impressos.

Logo e cores dos relatórios

Na seção Relatórios: logo, cores e impressão, escolha a cor principal e a cor secundária da empresa e clique em Salvar cores. O administrador faz essa escolha. As cores valem para os relatórios de visita e para os documentos impressos.

Usuários e acessos

Cadastre cada pessoa com um perfil, ajuste os módulos e defina quem é administrador. Para o almoxarife e o engenheiro de obra, as obras são definidas no cadastro da obra (capítulo 3).

Minha conta e mural de avisos

Em Minha conta, cada pessoa troca a própria senha. O Mural de avisos serve para recados à equipe.

Backup da empresa (dono)

Na seção Backup da empresa, em Configurações › Empresa, o dono guarda uma cópia de todos os dados da construtora, com a data do momento. Clique em Fazer backup agora. Os backups ficam listados e podem ser baixados por 30 dias. Para restaurar um backup, é preciso apoio técnico.

Exportação de dados

O botão Baixar exportação (.zip), na mesma tela, gera um arquivo com os dados da empresa para consulta.

> **Backup e exportação não são a mesma coisa**
>
> O backup serve para restaurar a empresa. A exportação serve para consulta e não restaura o sistema.

13 Rotinas recomendadas

Poucos minutos por dia e uma reunião curta por semana mantêm os números em dia.

QUANDO	O QUE FAZER	QUEM
Todo dia	Confira a fila de aprovações. Registre as solicitações, os pedidos e as notas fiscais recebidas. Ligue cada nota ao pedido e confira as divergências antes de confirmar.	Compras, almoxarife, gestor, dono
Toda vez que houver entrada	Imprima a etiqueta QR de cada entrada e cole no material antes de guardá-lo.	Almoxarife
Toda vez que houver retirada	Registre a retirada e a devolução de ferramentas e equipamentos, com a obra e quem retirou.	Almoxarife, engenheiro, dono
Toda semana	Concilie o extrato OFX. Registre a medição física das obras e confira o saldo a contratar das solicitações de serviço.	Financeiro, engenharia
Todo mês	Faça as medições de cada contrato e gere as autorizações de pagamento. Confira a Curva S e o DRE. Confira a depreciação dos bens. Faça um backup da empresa.	Engenharia, administrativo, dono
Ao encerrar contrato	Confirme as medições e a liberação da caução.	Engenharia, dono

Reunião de obra

Uma vez por semana, abra o acompanhamento de cada obra: o SPI mostra o atraso do cronograma e o CPI mostra se o gasto está dentro do executado.

14 Dúvidas frequentes

Problemas comuns e como resolver.

O QUE ACONTECE	O QUE FAZER
A medição não aceita a quantidade.	A quantidade passa do saldo do contrato. Confira a quantidade executada. Se o contrato precisa de mais quantidade, faça um aditivo antes.
A solicitação de serviço não mostra o serviço.	Escolha a obra primeiro. Os serviços listados são os do orçamento da obra. Se o serviço não aparece, cadastre-o no orçamento.
A Curva S não mostra meses ou não atualiza.	Verifique se o planejamento tem atividades ligadas à EAP. A curva vai até o mês de hoje.
O desconto não aparece no pagamento.	Os descontos são somados quando a autorização é gerada. Confira os descontos na medição antes de gerar a autorização.
A nota não é confirmada e mostra divergência com o pedido.	Leia a mensagem: ela aponta o item, o valor da nota e o valor do pedido. Corrija a ligação dos itens ou a quantidade recebida e confirme de novo.
O pedido não aparece para o almoxarife.	Ele só vê pedidos aprovados (ou já enviados, recebidos e encerrados) com itens de obras atribuídas a ele. Confira em Engenharia › Obras se ele está marcado como responsável.
A despesa não mostra o pedido.	O pedido precisa estar aprovado e sem despesa ou nota lançada. Se já tem um lançamento, cancele-o antes.
Uma entrada não gerou etiqueta.	Confira se o item tem obra, insumo da obra e etapa da EAP. Sem isso, o item não entra no estoque e não gera etiqueta.
O bem não pode ser retirado.	Ele pode estar em uso numa obra ou em manutenção. Devolva antes ou peça ao dono para mudar a situação.
A leitura por foto ou PDF não funciona.	Confira se o arquivo é PDF ou foto e tem até 10 MB. Se a mensagem disser que a leitura não está configurada, procure o suporte.
Não consigo ver saldos ou o fluxo de caixa.	Esses dados têm acesso restrito. Peça ao dono para ajustar os módulos.
Preciso restaurar o backup da empresa.	A restauração é feita com apoio técnico. Informe a data do backup que deseja restaurar.

14 Glossário

Os termos usados no sistema.

TERMO	SIGNIFICADO
Alçada	Até qual valor uma pessoa pode aprovar um pedido, contrato, medição ou autorização.
Autorização de pagamento	Documento que transforma uma medição em pagamento: bruto, retenções, descontos e líquido.
Caução	Parte de cada medição retida como garantia, que pode ser liberada ao encerrar o contrato.
Categoria	Grupo do plano de contas (por exemplo, 3.7 Serviços terceirizados).
Centro de custo	Onde a despesa é apropriada, normalmente a obra.
Cotação	Pedido de preços enviado a fornecedores, com o mapa para comparar as respostas.
CPI	Executado dividido pelo realizado. Abaixo de 1, o gasto está acima do executado.
Curva S	Gráfico mensal de previsto, executado e realizado da obra.
Depreciação linear	Redução do valor de um bem por igual a cada mês, durante a vida útil.
Descontos	Valores deduzidos do pagamento ao terceiro (adiantamento, alimentação, EPI).
Divergência	Diferença entre a nota fiscal e o pedido de compra (item, quantidade ou preço). Bloqueia a confirmação da nota.
EAP	Estrutura analítica da obra: etapas, subetapas e tarefas onde o orçamento é lançado.
Etiqueta QR	Etiqueta com código de barras em QR, fixa para cada entrada de estoque e para cada bem do patrimônio.
Frete CIF	Frete incluso no preço do fornecedor; não aparece separado no pedido.
Medição	Registro do que foi executado num período, por quantitativos, percentual ou valor.
Orçado	Quantidade ou custo previsto no orçamento da obra.
Patrimônio	Ferramentas e equipamentos próprios da construtora, cadastrados com valor e vida útil.
Pedido de compra	Compra aprovada com um fornecedor, gerada a partir da cotação. Vale para o recebimento e a despesa.
Retenções	Percentuais descontados de cada pagamento: caução, ISS, INSS, IR e PIS/COFINS/CSLL.
Saldo a contratar	Orçado menos o já contratado e o já medido de um serviço na obra.
SPI	Executado dividido pelo previsto. Abaixo de 1, a obra está atrasada.
Valor contábil	O que ainda resta de um bem depois da depreciação acumulada.
